

SỔ TAY
QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG SỬ
DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

năm 2026

MỤC LỤC

PHẠM VI, CÁCH SỬ DỤNG SỔ TAY	1
BẢNG CHỮ VIẾT TẮT	3
PHẦN A TRÌNH TỰ, THỦ TỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG	9
I. Giai đoạn chuẩn bị dự án	10
I.1. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A, B, C sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lý	10
I.2. Trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án	13
II. Giai đoạn thực hiện dự án	23
II.1. Trình tự, thủ tục chuẩn bị thực hiện dự án	23
II.2. Trình tự, thủ tục thực hiện dự án	25
III. Kết thúc dự án	36
PHẦN B CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO	41
Phụ lục 1 QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU	42
Bảng thời gian thực hiện các bước của dự án (để tham khảo) (<i>từ bước lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đến thời điểm khởi công xây dựng công trình</i>).	73
Phụ lục 2 Mẫu các Văn bản, Báo cáo, Tờ trình, Quyết định	74

MỘT SỐ CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÍNH CÓ LIÊN QUAN ĐỂ XÂY DỰNG CUỐN SỔ TAY NÀY.

Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật

Đấu thầu số 57/2024/QH15

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Luật Đất đai số 31/2024/QH15

Luật số 43/2024/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024

Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14;

Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14;

Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15;

Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15;

Luật số 90/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu;

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Nghị định số 206/2026/NĐ-CP, ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Nghị định số 212/2026/NĐ-CP, ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ Quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Nghị định số 217/2026/NĐ-CP, ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Nghị định số 347/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;

Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn;

Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất;

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 quy định chi tiết về đất trồng lúa

Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2024 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Nghị định số 99/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định việc quản;

lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông;

Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của luật kiến trúc;

Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn;

Nghị định số 150/2025/NĐ-CP, ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Nghị định số 189/2025/NĐ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết luật xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành

chính;

Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Thông tư số 79/2025/TT-BTC, ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư số 123/2014/TT-BTC hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS);

Thông tư số 157/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

PHẠM VI, CÁCH SỬ DỤNG SỔ TAY

1. Phạm vi: Sổ tay này mô tả trình tự, thủ tục đầu tư đối với các chương trình, dự án đầu tư công vốn ngân sách nhà nước (*Sổ tay này không áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp; dự án thuộc phạm vi quản lý của Trung ương; dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo Luật Di sản*).

2. Cách sử dụng sổ tay: Tất cả các thủ tục hành chính thực hiện dự án được minh họa bằng sơ đồ tổng quát và các bước thực hiện trong các giai đoạn được thể hiện theo quy trình chi tiết nhằm thể hiện chi tiết một cách tổng quan toàn bộ quá trình thực hiện dự án. Đối với phần hồ sơ mẫu được cập nhật trên cơ sở các mẫu được ban hành kèm theo các quy định của pháp luật được cụ thể hóa, chi tiết tại các mẫu trong cuốn sổ tay này. Các cơ quan, đơn vị có thể tham khảo tại cuốn Sổ tay hướng dẫn này để đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định.

Trình tự đầu tư xây dựng dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Xây dựng năm 2025 được quy định cụ thể như sau:

a) Giai đoạn chuẩn bị dự án gồm các công việc: lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (sau đây gọi là Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (nếu có); lập đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (vốn ODA), vốn vay ưu đãi nước ngoài (nếu có); lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch làm căn cứ lập dự án (nếu có); khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án; lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (sau đây gọi là Báo cáo nghiên cứu khả thi) hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (sau đây gọi là Báo cáo kinh tế - kỹ thuật); phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng; tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành; các công việc được cho phép thực hiện trước theo quy định của pháp luật và các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án;

b) Giai đoạn thực hiện dự án gồm các công việc: chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt, dự toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng); ký kết hợp đồng xây dựng; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành; vận hành, chạy thử; nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; bàn giao công trình đưa vào sử dụng; quyết toán hợp đồng xây dựng; các công việc cần thiết khác liên quan đến thực hiện dự án;

c) Giai đoạn kết thúc xây dựng gồm các công việc: quyết toán hợp đồng xây dựng (nếu có), quyết toán vốn đầu tư xây dựng; bảo hành công trình xây dựng, bàn giao các hồ sơ liên quan; các công việc cần thiết khác liên quan đến dự án.

Sổ tay cung cấp thông tin chung trong suốt chu kỳ hoạt động của dự án. Tùy theo từng dự án sẽ xem xét thực hiện một, một số hoặc tất cả các thủ tục theo trình tự các bước và có thể thực hiện đồng thời các thủ tục trong dự án đầu tư công.

Sổ tay là một nguồn tham khảo về trình tự, thủ tục các dự án sử dụng vốn đầu

tư công giúp cho các cơ quan, đơn vị dễ dàng tra cứu trong quá trình triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện cần rà soát tuân thủ các quy định hiện hành để đảm bảo đầy đủ trình tự, nội dung theo quy định của pháp luật. Các nội dung khác không đề cập trong cuốn Sổ tay này thì được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu trong sổ tay này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản mới thì các nội dung được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó.

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT

STT	Nội dung	Chữ viết tắt
I	Chữ viết tắt thông thường	
1	An ninh trật tự	ANTT
2	An toàn giao thông	ATGT
3	Ban quản lý dự án	BQLDA
4	Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	BCNCTKT
5	Báo cáo nghiên cứu khả thi	BCNCKT
6	Báo cáo đánh giá tác động môi trường	BC ĐTM
7	Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật	BCKT-KT
8	Báo cáo thẩm định	BCTĐ
9	Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư	BT,HT&TĐC
10	Bảo vệ môi trường	BVMT
11	Bên mời thầu	BMT
12	Biên bản	BB
13	Biên bản mở thầu	BBMT
14	Căn hộ chung cư	CHCC
15	Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy	CSPCCC
16	Chất lượng công trình	CLCT
17	Chủ trương đầu tư	CTrĐT
18	Chủ đầu tư	CĐT
19	Chuẩn bị đầu tư	CBĐT
20	Chuẩn bị dự án	CBDA
21	Công An	CA
22	Công trình	CT
23	Công trình xây dựng	CTXD

STT	Nội dung	Chữ viết tắt
24	Cơ quan	CQ
25	Cứu hộ, cứu nạn	CHCN
26	Danh sách xếp hạng	DSXH
27	Danh sách nhà thầu	DSNT
28	Dịch vụ công	DVC
29	Doanh nghiệp	DN
30	Dự án	DA
31	Dự toán	DT
32	Dự toán công trình	DTCT
33	Đánh giá hồ sơ dự thầu	ĐGHSDT
34	Đánh giá tác động môi trường	ĐTM
35	Đấu thầu không qua mạng	ĐTKQM
36	Đấu thầu qua mạng	ĐTQM
37	Đấu thầu trong nước	ĐTTN
38	Đấu thầu quốc gia	ĐTQG
39	Đấu thầu quốc tế	ĐTQT
40	Đầu tư công	ĐTC
41	Đầu tư xây dựng	ĐTXD
42	Đơn vị tư vấn	ĐVTV
43	Giám sát, đánh giá	GSDG
44	Giải phóng mặt bằng	GPMB
45	Hạ tầng kỹ thuật	HTKT
46	Hạng mục công trình	HMCT
47	Hệ thống giao thông	HTGT
48	Hệ thống mạng	HTM
49	Hồ sơ yêu cầu	HSYC
50	Hồ sơ mời thầu	HSMT
51	Hồ sơ mời sơ tuyển	HSMST
52	Hồ sơ dự sơ tuyển	HSDST

STT	Nội dung	Chữ viết tắt
53	Hồ sơ đề xuất	HSĐX
54	Hồ sơ dự thầu	HSDT
55	Hồ sơ thiết kế	HSTK
56	Hợp đồng	HĐ
57	Hội đồng nhân dân	HĐND
58	Hội đồng thẩm định	HĐTĐ
59	Kế hoạch	KH
60	Kế hoạch và Đầu tư	KH&ĐT
61	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	KHLCNT
62	Kết quả thẩm định	KQTĐ
63	Kết quả chỉ định thầu	KQCĐT
64	Khảo sát, đo đạc	KSĐĐ
65	Khảo sát, thiết kế	KSTK
66	Khảo sát xây dựng	KSXD
67	Kho bạc Nhà nước	KBNN
68	Kinh tế - kỹ thuật	KT-KT
69	Lựa chọn nhà thầu	LCNT
70	Làm việc	l/v
71	Năng lực kinh nghiệm	NLKN
72	Ngân sách nhà nước	NSNN
73	Phương án	PA
74	Quan trọng quốc gia	QTQG
75	Quản lý chất lượng	QLCT
76	Quản lý dự án	QLDA
77	Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	KT,HT&ĐT
78	Quản lý nhà nước	QLNN
79	Quản lý sử dụng	QLSD
80	Quốc phòng	QP
81	Quốc phòng an ninh	QPAN
82	Quy hoạch	QH
83	Quy hoạch Kiến trúc	QHKT
84	Quyết toán	QT
85	Sở Xây dựng	SXD
86	Tái định cư	TĐC
87	Sở Tài chính	STC
88	Tài chính - Kế hoạch	TC-KH

STT	Nội dung	Chữ viết tắt
89	Tài khoản	TK
90	Tài nguyên và Môi trường	TN&MT
91	Tài sản	TS
92	Tài sản công	TSC
93	Thanh lý tài sản công	TLTSC
94	Thanh toán	TT
95	Thiết kế cơ sở	TKCS
96	Thiết kế dự toán	TKDT
97	Thiết kế xây dựng	TKXD
98	Thông báo	TB
99	Thông báo mời thầu	TBMT
100	Thực hiện dự án	THDA
101	Tổng mức đầu tư	TMĐT
102	Tư vấn thiết kế	TVTK
103	Công trình xây dựng chuyên ngành	CTXDCN
104	Ủy ban nhân dân	UBND
105	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	UBMTTQ
106	Ủy quyền	UQ
107	Xây dựng công trình	XDCT
108	Yêu cầu kỹ thuật	YCKT
109	Vốn đầu tư	VĐT
II	Viết tắt tên các VBQPPL	
1	Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15	Luật số 58/2024/QH15
2	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15	Luật số 57/2024/QH15
3	Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15	Luật số 22/2023/QH15
4	Luật Đất đai số 31/2024/QH15	Luật số 31/2024/QH15
5	Luật số 43/2024/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024	Luật số 43/2024/QH15
6	Luật Xây dựng số 135/2025/QH15	Luật số 135/2025/QH15

STT	Nội dung	Chữ viết tắt
7	Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14	Luật số 72/2020/QH14
8	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14	Luật số 15/2017/QH14
9	Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14	Luật số 40/2019/QH14
10	Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15	Luật số 47/2024/QH15
11	Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15	Luật số 55/2024/QH15
12	Luật số 90/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công	Luật số 90/2025/QH15
13	Nghị định số 206/2026/NĐ-CP, ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.	NĐ số 206
14	Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.	NĐ số 207
15	Nghị định số 212/2026/NĐ-CP, ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ Quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng	NĐ số 212
16	Nghị định số 217/2026/NĐ-CP, ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng	NĐ số 217
17	Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng	NĐ số 210
18	Nghị định số 347/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước	NĐ số 347
19	Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn	NĐ số 178
20	Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công	NĐ số 85


STT	Nội dung	Chữ viết tắt
21	Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai	NĐ số 102
22	Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất	NĐ số 71
23	Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất	NĐ số 88
24	Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 quy định chi tiết về đất trồng lúa	NĐ số 112
25	Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công	NĐ số 254
26	Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án	NĐ số 193
27	Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ	NĐ số 105
28	Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công	NĐ số 186
29	Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu	NĐ số 214
30	Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2024 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ	NĐ số 44
31	Nghị định số 99/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông.	NĐ số 99

STT	Nội dung	Chữ viết tắt
32	Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của luật kiến trúc	NĐ số 85
33	Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng	NĐ số 140
34	Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng	NĐ số 144
35	Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn	NĐ số 145
36	Nghị định số 150/2025/NĐ-CP, ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn	NĐ số 150
37	thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương	
38	Nghị định số 189/2025/NĐ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết luật xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính	NĐ số 189
39	Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán	TT số 91
40	Thông tư số 79/2025/TT-BTC, ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	TT số 79
41	Thông tư số 123/2014/TT-BTC hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)	TT số 123
42	Thông tư số 157/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước	TT số 157

PHẦN A

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG


***Sơ đồ tổng quát**

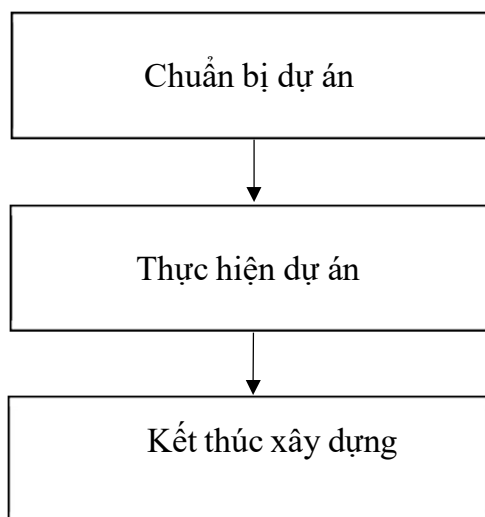

I. Giai đoạn chuẩn bị dự án (CBDA)

I.1. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A, B, C sử dụng vốn ĐTC do địa phương quản lý

1. Sơ đồ tổng quát

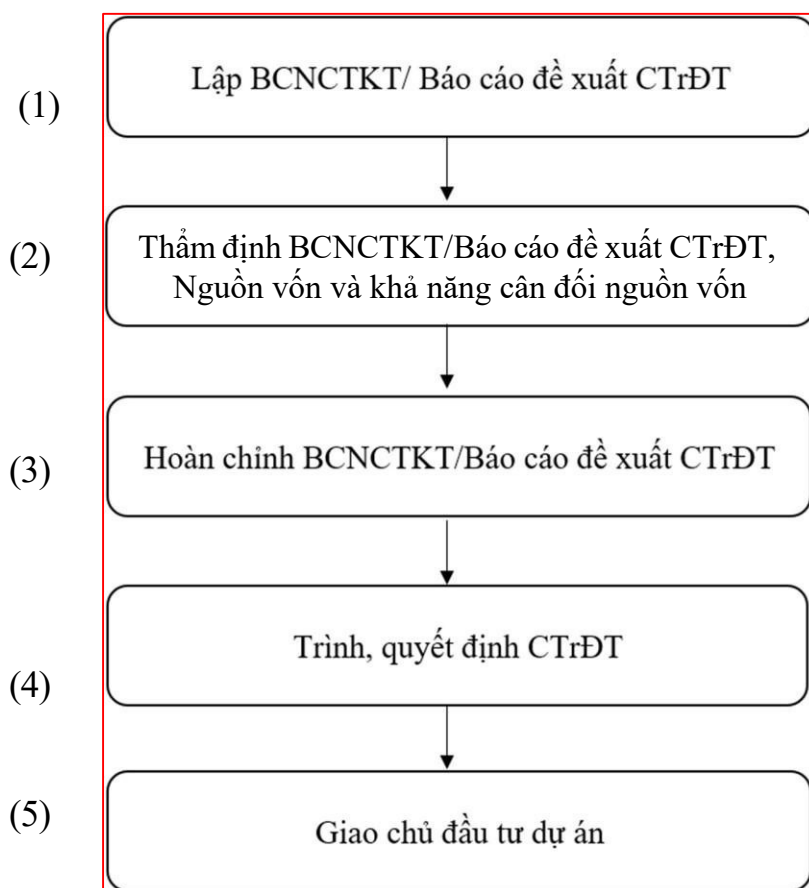

2. Quy trình chi tiết


TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
Bước 1: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT)/ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (CTrĐT)				
1	Giao đơn vị trực thuộc, bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc hoặc UBND cấp dưới trực tiếp lập BCNCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT	Chủ tịch UBND các cấp	- Khoản 10 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15 - Điểm a khoản 1 các điều 27, 28 Luật số 58/2024/QH15	
2	Lập BCNCTKT/Báo cáo đề xuất CTrĐT, thành phần hồ sơ như sau: - Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án đầu tư công; - Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công ;Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C: Theo quy định tại Điều 34, Điều 35 Luật ĐTC số 58 (<i>Lưu ý về Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội</i>); Các tài liệu khác (<i>nếu có</i>). Thời gian thực hiện tối đa: + Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: 20 ngày + Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: 30 ngày	Đơn vị được giao lập BCNCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT	Các điều 34, 35 Luật số 58/2024/QH15	Các mẫu số 1, 2, 3,4
Bước 2: Thẩm định BC NCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn				
1	- Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng thẩm định BCNCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án thuộc cấp mình quản lý.	Chủ tịch UBND các cấp	Điểm b khoản 1 các điều 25, 27, 28, 30, 31 Luật số 58/2024/QH15	
2	Hồ sơ trình thẩm định BCNCTKT/Báo cáo đề xuất	Đơn vị được giao lập	Mẫu Tờ trình theo hướng dẫn tại Nghị định	

	CTrĐT: - Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt BCNCTKT/CTrĐT; - BCNCTKT/Báo cáo đề xuất CTrĐT theo nội dung tại Điều 33, Điều 34, Điều 35 Luật ĐTC số 58. Các tài liệu khác (nếu có).	BCNCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT	hướng dẫn thi hành Luật số 58/2024/QH15	
3	- Tiếp nhận và tổ chức thẩm định BCNCTKT đối với DA nhóm A, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.	Hội đồng thẩm định (<i>Cơ quan thường trực là Sở TC</i>)	Điểm b khoản 1 Điều 25 Luật ĐTC số 58	Mã số 5,6
	- Tiếp nhận và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất CTrĐT chương trình đầu tư công, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình đầu tư công do địa phương quản lý.	Hội đồng thẩm định/ Đơn vị có chức năng	Điểm b khoản 1 Điều 27 Luật số 58/2024/QH15	
	- Tiếp nhận và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất CTrĐT đối với dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các cấp	Hội đồng thẩm định/ Đơn vị có chức năng	Điểm b khoản 1 Điều 28 Luật số 58/2024/QH15	
	*Lưu ý nội dung thẩm định, nội dung đánh giá sơ bộ ĐTM được thẩm định đồng thời với việc thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định CTrĐT.		- Khoản 2,3 Điều 11 NĐ số 85	
4	* Thời gian thẩm định theo quy định: DA nhóm A: Không quá 30 ngày; DA nhóm B, C: Không quá 20 ngày. * Thời gian phần đấu thực hiện thẩm định: DA nhóm A: Không quá 20 ngày; DA nhóm B, C: Không quá 10 ngày		Khoản 5 Điều 11 NĐ số 85	
Bước 3: Hoàn thiện BCNCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT				
1	Hoàn thiện BCNCTKT/Báo cáo đề xuất CTrĐT theo ý kiến của Hội đồng thẩm định/đơn vị có chức năng	Đơn vị được giao lập BCNCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT	Điểm c khoản 1 các điều 25, 27, 28 Luật số 58/2024/QH15	
Bước 4: Quyết định CTrĐT				

1	Trình duyệt quyết định CTrĐT, thành phần hồ sơ: - Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định CTrĐT; - BCNCKTKT nhóm A/Báo cáo đề xuất CTrĐT dự án nhóm B, nhóm C; Báo cáo thẩm định CTrĐT dự án. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).	Đơn vị được giao lập BCNCKTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT	Khoản 2 điều 25, 27, 28 Luật số 58/2024/QH15.	Mẫu số 1
2	Tổng hợp báo cáo UBND các cấp xem xét quyết định chủ trương đầu tư/trình HĐND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư	Hội đồng thẩm định/ Đơn vị có chức năng		Mẫu số 5,6
3	Nghị quyết (Quyết định) về chủ trương đầu tư chương trình; Nghị quyết (Quyết định) về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công	HĐND hoặc UBND các cấp	Khoản 17 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15	Mẫu số 7,8
Bước 5: Giao CĐT dự án				
1	Giao CĐT dự án	Người quyết định đầu tư	Điều 9 Luật số 135/2025/QH15	

I.2. Trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án

1. Sơ đồ tổng quát

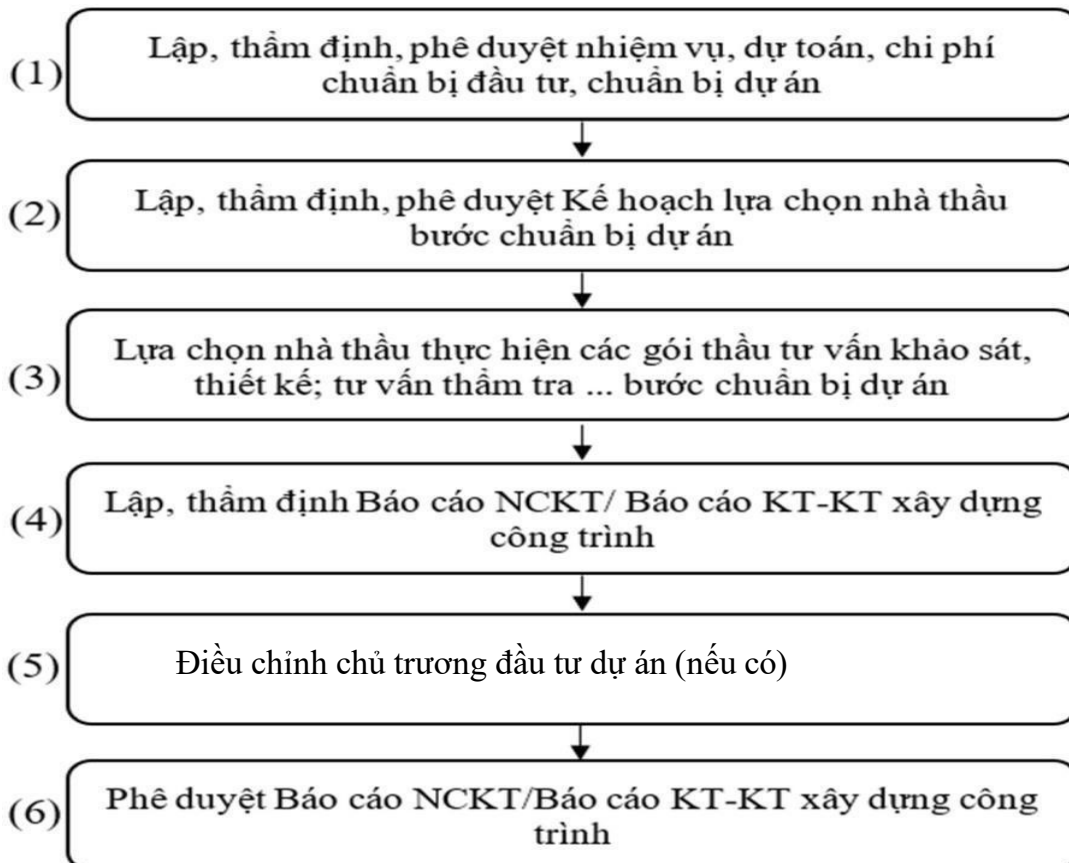

2. Quy trình chi tiết

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
Bước 1: Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí CBĐT, CBDA				
1	Đối với dự án ĐTC không có cấu phần xây dựng			
1.1	Lập hồ sơ trình, bao gồm các chi phí: Lập, thẩm định BCNCKT, BCKT-KT và các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án (CBDA).	CQ, tổ chức được giao NV CBDA hoặc CĐT	Khoản 2 Điều 44 Luật số 58/2024/QH15	
1.2	Thẩm định nhiệm vụ, dự toán chi phí CBĐT, CBDA: - Tờ trình đề nghị thẩm định; - Hồ sơ dự toán chi phí CBĐT, CBDA; - Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).	HĐTĐ/CQ chuyên môn quản lý ĐTC/ đơn vị được cơ quan, đơn vị trực thuộc, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc giao tổ chức thẩm định (trường hợp được phân cấp theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 44 Luật ĐTC số 58)	Khoản 2 Điều 44 Luật số 58/2024/QH15	
1.3	Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí CBĐT, CBDA. * Thành phần hồ sơ gồm: Tờ trình; Hồ sơ; BCTĐ nhiệm vụ, chi phí CBĐT, CBDA; Các tài liệu khác có liên quan.	Chủ tịch UBND các cấp/ người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc, đơn vị sự nghiệp công lập trực (trường hợp được phân cấp theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 44 Luật ĐTC)	Khoản 2 Điều 44 Luật số 58/2024/QH15	
2	Đối với dự án ĐTC có cấu phần xây dựng			
2.1	Lập hồ sơ trình, bao gồm các chi phí: KSXD; lập, thẩm định BCNCKT, Báo cáo đề xuất CTrĐT (nếu có); lập, thẩm định BCNCKT, BC KT-KT và các công việc cần thiết khác liên quan đến CBDA.	CQ, tổ chức được giao NV CBDA hoặc CĐT (trong trường hợp đã xác định được CĐT)	Điều 11 NB số 206.	
2.2	Thẩm định chi phí CBDA, cụ thể: Tờ trình đề nghị thẩm định; Hồ sơ DTCP, CBĐT, CBDA Các tài liệu khác có liên quan			

2.3	Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí CBĐT, CBDA			
3	Đối với Dự toán thực hiện công việc CBDA đầu tư			
3.1	Lập hồ sơ BCNCTKT (được giao đơn vị trực thuộc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (BQLDA ĐTXD) - quy định tại điểm a khoản 1, Điều 20 Luật ĐTC số 58)	CQ, ĐV được giao NV CBDA hoặc CĐT (trong trường hợp đã xác định được CĐT)	- Điều 11 NĐ số 206.	
3.2	Thẩm định Phê duyệt	Cơ quan chuyên môn/Người quyết định đầu tư	Khoản 1, 2 Điều 44 Luật số 58/2024/QH15	
Bước 2: Lập, thẩm định, phê duyệt KHLCNT bước CBĐT, CBDA (đối với các gói thầu cần thực hiện trước khi phê duyệt dự án)				
1	Lập Tờ trình phê duyệt KH LCNT: Căn cứ lập KH LCNT; Nội dung KH LCNT; Tài liệu kèm theo VB trình.	Đơn vị thuộc CĐT (Đơn vị được giao nhiệm vụ CBDA trường hợp chưa xác định được CĐT)	- Điều 37; Khoản 1 Điều 38; Điều 39 Luật số 22/2023/QH15	Mẫu số 9
2	Phê duyệt KH LCNT * Người có thẩm quyền quy định thời gian phê duyệt (tối đa 10 ngày)	CĐT (hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ CBDA)	Khoản 22 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15	Mẫu số 10
3	Đăng tải quyết định phê duyệt KH LCNT * Lưu ý thời gian đăng tải lên Hệ thống mạng ĐTQG không muộn hơn 05 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.	Người được giao thực hiện công trình (CĐT)	- Điểm a, Khoản 1; Khoản 4 Điều 8 Luật số 22/2023/QH15	
Bước 3: LCNT khảo sát, tư vấn lập QH (nếu có), thiết kế XD; tư vấn thẩm tra... bước CBĐT, CBDA				
1	LCNT tư vấn theo KHLCNT được phê duyệt và Quy trình các bước thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1			
2	Tổ chức KSĐĐ	CĐT, Đơn vị TVKS		
3	Cung cấp thông tin, chỉ giới đường đỏ, cung cấp số liệu HTKT (Khu vực chưa có QH chi tiết tỷ lệ 1/500)	CĐT, SXD, UBND cấp xã		
Bước 4: Thi tuyển PA kiến trúc; Lập, thẩm định, phê duyệt QH chi tiết (nếu có)				
1	Thi tuyển PA kiến trúc (nếu có)			

1.1	Công trình phải thi tuyển phương án kiến trúc		Khoản 2 Điều 17 Luật số 40/2019/QH14	
1.2	Việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc được đề xuất trong chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.	CQ, đơn vị được giao lập BCNCTKT/ Báo cáo đề xuất CTrĐT	Khoản 3 Điều 17 Luật số 40/2019/QH14	
1.3	Lập, thống nhất nội dung, trình phê duyệt: Hình thức, kế hoạch, chi phí tổ chức thi tuyển; ban hành Quy chế thi tuyển và Nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc công trình.	CĐT (đơn vị tổ chức thi tuyển), Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Sở Xây dựng	- Điều 16 NĐ số 85 - Điểm b, khoản 1 Điều 18 NĐ số 85 - Khoản 2, khoản 3 Điều 18 NĐ số 85	
1.4	Phê duyệt: Hình thức, kế hoạch, chi phí tổ chức thi tuyển; ban hành Quy chế thi tuyển và Nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc công trình.	Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp xã	Khoản 4 Điều 17 Luật số 40/2019/QH14	
1.5	Mời tham gia và đề nghị thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc	CĐT (đơn vị tổ chức thi tuyển); Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Sở Xây dựng	Điều 19 NĐ số 85	
1.6	Thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc	Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện	Khoản 4 Điều 17 Luật số 40/2019/QH14	
1.7	Đăng tải công khai thông tin thi tuyển, tiếp nhận hồ sơ phương án kiến trúc công trình do các tổ chức, cá nhân tham gia thi tuyển. - Thời gian đăng tải thông tin về thi tuyển tối thiểu 30 ngày;	CĐT (đơn vị tổ chức thi tuyển), tổ chức, cá nhân tham gia thi tuyển	Khoản 4 Điều 17 NĐ số 85	
1.8	- Đánh giá, xếp hạng phương án dự thi, trình phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình.	- Hội đồng thi tuyển - CĐT (đơn vị tổ chức thi tuyển)	Điều 20 NĐ số 85	
1.9	Phê duyệt kết quả thi tuyển, công bố công khai kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình, trao giải thưởng và gửi	Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp xã, CĐT (đơn vị tổ chức thi tuyển)	Khoản 2, khoản 4 Điều 20 NĐ số 85	

	kết quả thi tuyển đến CQCM về XD.			
2	Lập, thẩm định QH chi tiết, QH chi tiết rút gọn (QH tổng mặt bằng)	CĐT, SXD, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.	- Điều 16 Luật số 47/2024/QH15 - ND số 178/2025/ND-CP	
2.1	- Đối với QH chi tiết rút gọn (QH tổng mặt bằng): Nội dung hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 178/2025/ND-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến, thẩm định phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng thực hiện theo trình tự, thủ tục lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết đối với dự án đầu tư xây dựng (theo mục 2.2, trừ bước lập, thẩm định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch).			
2.2	Đối với QH chi tiết			
	a) Nhiệm vụ QH - Thời gian lập nhiệm vụ QH không quá 01 tháng. - Lấy ý kiến về Nhiệm vụ quy hoạch (đối tượng lấy ý kiến là các cơ quan QLNN có liên quan): Các cơ quan được yêu cầu có trách nhiệm cho ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. - Thời gian thẩm định theo quy định: không quá 15 ngày kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. - Thời gian phân đấu thực hiện thẩm định: không quá 10 ngày kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. Thời gian phê duyệt: 10 ngày	CĐT, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị. <i>(Trường hợp Quy hoạch có phạm vi liên quan đến địa giới đơn vị hành chính (ĐVHC) của 02 ĐVHC cấp xã trở lên – Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt)</i>	Điều 36 Luật số 47/2024/QH15 -Khoản 4 Điều 40 Luật số 47/2024/QH15	

	b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập QH Thời gian thực hiện: - Đấu thầu lựa chọn TV: Tối thiểu 47 ngày - Chỉ định thầu rút gọn: Tối thiểu 15 ngày - Chỉ định thầu thông thường: Tối thiểu 30 ngày, tối đa 45 ngày (Quy trình các bước LCNT hướng dẫn tại Phụ lục số 1).	CĐT		
	c) Đồ án QH - Thời gian lập Đồ án QH: + Theo quy định không quá 06 tháng. + Phân đấu thực hiện: không quá 05 tháng.	CĐT, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị. <i>(Trường hợp Quy hoạch có phạm vi liên quan đến địa giới đơn vị hành chính (ĐVHC) của 02 ĐVHC cấp xã trở lên – Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt)</i>	Khoản 3 Điều 4 NĐ 178/2025/NĐ- CP	
	Lấy ý kiến về quy hoạch: + Đối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và chuyên gia có liên quan: Các cơ quan, tổ chức và chuyên gia được yêu cầu cho ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định + Đối với cộng đồng dân cư: Thời gian lấy ý kiến ít nhất là 20 ngày và không quá 30 ngày kể từ ngày công khai nội dung lấy ý kiến. Trong trường hợp chưa hết thời gian lấy ý kiến mà đã nhận được đầy đủ ý kiến của cộng đồng dân cư thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị và nông thôn được thực hiện các bước tiếp theo - Thời gian thẩm định theo quy		- Khoản 6 Điều 37 Luật số 47/2024/QH15 - Khoản 7 Điều 37 Luật số 47/2024/QH15 - Khoản 4 Điều 40 Luật số 47/2024/QH15	

	định: không quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định - Thời gian phân đấu thực hiện thẩm định: không quá 25 ngày kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định - Thời gian phê duyệt: 10 ngày			
2.3	Phê duyệt QH chi tiết, QH chi tiết rút gọn (QH tổng mặt bằng)	UBND tỉnh, UBND cấp xã		

Bước 5: Lập, thẩm định, phê duyệt BCNCKT và BCKT-KT

1	Lập BCNCKT và BCKT-KT - Thời gian thực hiện (không có văn bản quy định cụ thể mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chủ yếu là quy mô, nguồn vốn và tính chất của dự án) để chọn. Do vậy để đẩy nhanh tiến độ nên quy định tối đa: + Dự án nhóm A: Thời gian khảo sát, lập báo cáo NCKT: 90 ngày + Dự án nhóm B, C: Thời gian khảo sát, lập báo cáo NCKT: 60 ngày	CĐT, ĐVTV		
2	Thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước; đấu nối giao thông; thỏa thuận về chiều cao tầng không và các thỏa thuận về kết nối hạ tầng khác (nếu có) Thời gian thực hiện: 20 ngày	Các DN quản lý hệ thống HTKT; cơ quan, đơn vị quản lý HTGT, HTKT theo phân cấp; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh		

3	Lập trình thẩm định, phê duyệt ĐTM/ Kế hoạch BVMT Thời gian phần đầu thực hiện: 45 ngày			
a	Lập ĐTM/ Kế hoạch BVMT	CĐT, ĐVTV	- Luật số 72/2020/QH14	
b	Thẩm định ĐTM/Giấy phép MT	HĐTĐ Bộ NN&MT; Bộ QP, Bộ CA (đối với các dự án QPAN); Sở NN&MT	Điều 34, 35 Luật số 72/2020/QH14	
c	Phê duyệt KQTD ĐTM/Giấy phép MT	Bộ NN và MT, UBND tỉnh	Điều 36 Luật số 72/2020/QH14	
	* Lưu ý việc quyết định phê duyệt KQTD ĐTM/ Kế hoạch BVMT			
4	Nội dung BCNCKT	CĐT, ĐVTV lập BCNCKT	Điều 29 NĐ số 217.	
5	Nội dung BCKT-KT	CĐT, ĐVTV lập BCKT-KT	Điều 30 NĐ số 217.	
6	Thẩm định BCNCKT/ BCKT-KT	Người QĐ đầu tư, cơ quan chuyên môn về XD	Điều 31 ÷ 36 NĐ số 217.	
a	Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định - Hồ sơ gồm: Tờ trình thẩm định dự án của CĐT; Dự án; Các tài liệu, văn bản có liên quan.	CQ chủ trì thẩm định/Sở quản lý CTXDCN/ Phòng Kinh tế cấp xã	- Điều 35 NĐ số 217	Mẫu số 11

b	Tổng hợp kết quả thẩm định, trình người quyết định đầu tư phê duyệt DA * Thời gian thẩm định theo Quy định: - Không quá 60 ngày đối với dự án quan trọng quốc gia; - Không quá 25 ngày làm việc đối với dự án nhóm A có công trình cấp I trở lên; không quá 20 ngày làm việc đối với các dự án nhóm A còn lại; - Không quá 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm B có công trình cấp I trở lên; không quá 16 ngày làm việc đối với các dự án nhóm B còn lại; - Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm C có công trình cấp I trở lên; không quá 12 ngày làm việc đối với các dự án nhóm C còn lại.	CQ chủ trì thẩm định/Sở quản lý CTXDCN/ Phòng Kinh tế cấp xã	- Điều 37 ND số 217	Mẫu số 11 a, b, c
---	---	--	---------------------	-------------------

Bước 6: Điều chỉnh CTrĐT dự án (nếu có)(đối với trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 14 ND số 85)

1	Quy trình, thủ tục quyết định điều chỉnh CTrĐT		Điều 37 Luật số 58/2024/QH15	
2	Hồ sơ, trình tự, thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh CTrĐT dự án		Điều 14 ND số 85.	

Bước 7: Phê duyệt dự án

1	Trình duyệt quyết định đầu tư DA	CQ chủ trì thẩm định		
2	Thẩm quyền phê duyệt DA	Chủ tịch UBND các cấp	Khoản 1 Điều 28 Luật số 135/2025/QH15	Mẫu số 12 a,b
3	* Thời gian phê duyệt: DA nhóm A: không quá 7 ngày; - DA nhóm B, C: không quá 5 ngày.	Chủ tịch UBND các cấp	Vận dụng khoản 2 Điều 12 ND số 85	


Bước 8: Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh BCNCKT, BCKT-KT, điều chỉnh thiết kế XD triển khai sau khi dự án được phê duyệt (nếu có)

1	Các trường hợp điều chỉnh DA		Khoản 2 Điều 28 Luật số 135/2025/QH15	
2	Thẩm định BCNCKT/ BCKT-KT điều chỉnh			
a	Thẩm định BCNCKT điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng	Sở quản lý CTXDCN/ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cấp xã	Khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 40 NĐ số 217	
b	Thẩm định BCKT-KT điều chỉnh của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư	Đơn vị được Người quyết định đầu tư giao thẩm định	Khoản 6 Điều 40 NĐ số 217	
3	Thẩm quyền Phê duyệt DA điều chỉnh	Chủ tịch UBND các cấp	Khoản 1 Điều 28 Luật số 135/2025/QH15	

II. Giai đoạn thực hiện dự án (THDA)

II. 1. Trình tự, thủ tục chuẩn bị THDA

1. Sơ đồ tổng quát

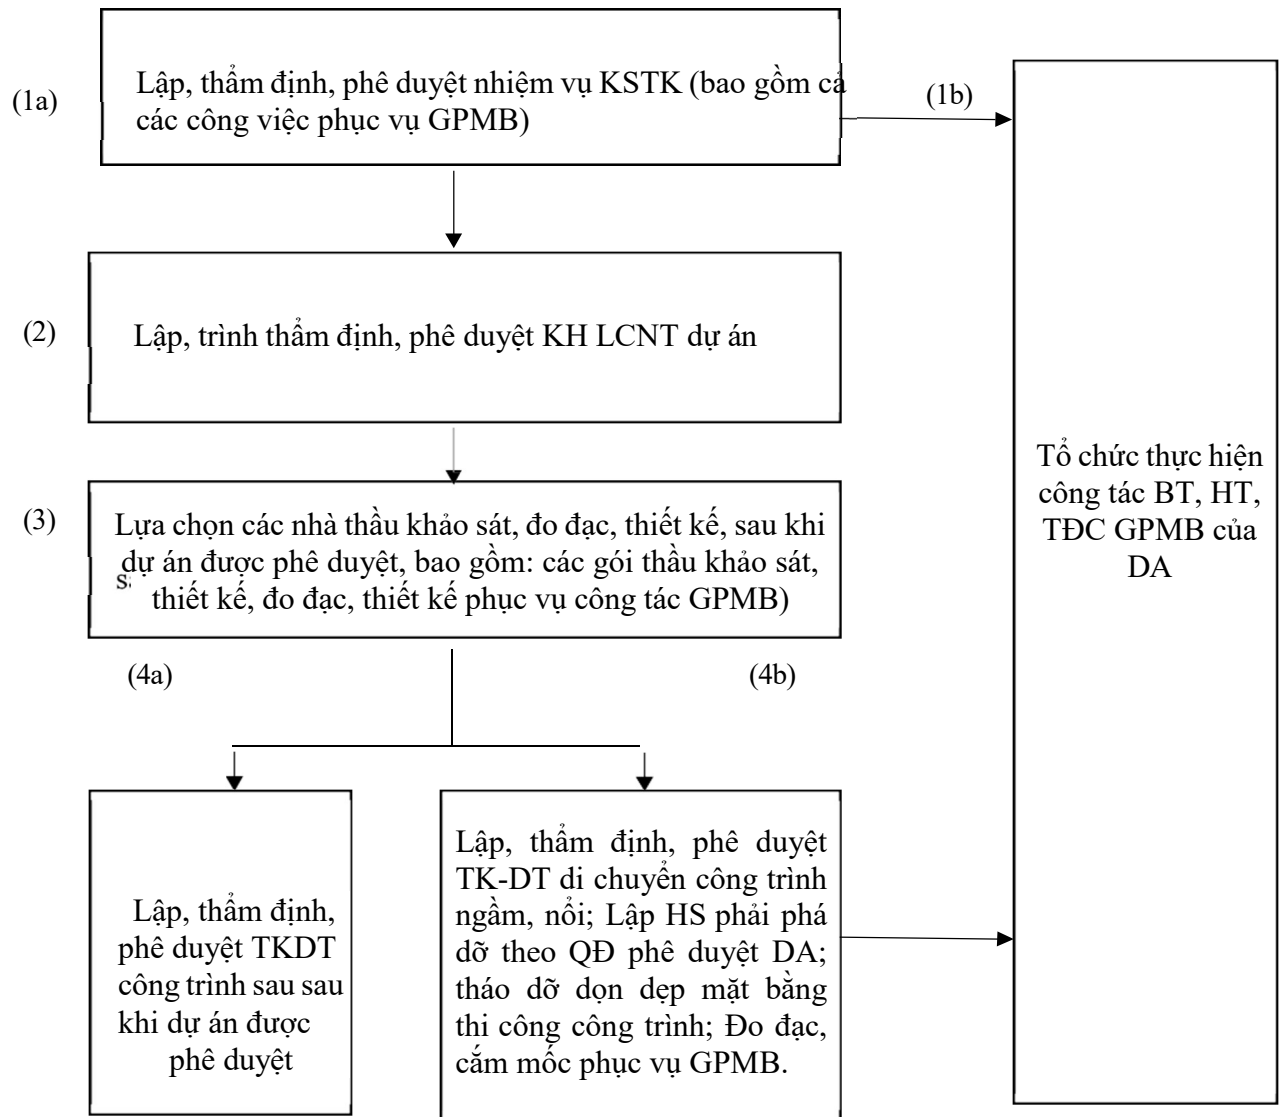

2. Quy trình chi tiết:


TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Điều, khoản áp dụng	Ghi chú
Bước 1a: Lập, thẩm định, phê duyệt NV KSTK (triển khai sau khi dự án được phê duyệt; bao gồm cả các công việc phục vụ GPMB của DA - nếu có)				
1	Lập, phê duyệt nhiệm vụ KSTK; PA khảo sát triển khai khi dự án được phê duyệt (bao gồm cả các công việc phục vụ công tác GPMB của DA)	CĐT, đơn vị tư vấn	- Từ điều 10 ÷ 15 NĐ số 217.	
2	Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ KSTK xây dựng triển khai sau sau	CĐT	- Điều 17 NĐ số 217. - Điều 17 NĐ số 206.	

	khi dự án được phê duyệt , bao gồm cả DT			
Bước 2: Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án				
1	Lập Tờ trình đề nghị phê duyệt KHLCNT cho dự án, bao gồm 04 phần công việc: *Phần công việc đã thực hiện; - Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức LCNT; *Phần công việc thuộc KH LCNT; - Phần công việc chưa đủ điều kiện lập KHLCNT. <i>(Với những dự án thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu thì tại giai đoạn thực hiện dự án, chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo điểm b, khoản 22 điều 1 Luật số 90)</i>	Chủ đầu tư	Các điều 36, 37, 38, và 39 Luật số 22/2023/QH15	Mẫu số 9
2	Phê duyệt KH LCNT một số hoặc các gói thầu giai đoạn THDA * Thời gian theo quy định: Người có thẩm quyền quyết định (tối đa 10 ngày) - Thời gian phân đấu thực hiện: 03 ngày	Chủ đầu tư	- Điều 40 Luật số 22/2023/QH15; - Điểm b, khoản 22 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15	Mẫu số 10
3	Đăng tải quyết định phê duyệt KH LCNT			
	* Lưu ý: Thời gian đăng tải KH tổng thể LCNT/KHLCNT lên Hệ thống mạng DTQG không muộn hơn 05 ngày làm việc, kể từ ngày VB được ban hành	CĐT	Khoản 5 Điều 16 NB số 214; - Khoản 1 Điều 7, Khoản 4, Điều 8 Luật số 22/2023/QH15	
Bước 3: Lựa chọn các nhà thầu KSXD, TVTK,.. sau khi dự án được phê duyệt, bao gồm: các gói thầu khảo sát, đo đạc, thiết kế phục vụ công tác GPMB)				
1	Lựa chọn các nhà thầu KSXD, TVTK; tư vấn thẩm tra triển khai sau khi dự án được phê duyệt và phục vụ công tác GPMB. * Lưu ý: Việc lựa chọn đơn vị KSXD, TVTK; tư vấn thẩm tra,... theo KHLCNT được duyệt và Quy trình các bước LCNT hướng dẫn	CĐT, BMT, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định		

	tại Phụ lục số 1.			
Bước 4a: Lập, thẩm định, phê duyệt TK-DT công trình (TKXD triển khai sau khi dự án được phê duyệt; bao gồm cả KSTK - DT di chuyển công trình ngầm, nổi; đo đạc, cắm mốc... phục vụ công tác GPMB)				
1	Lập hồ sơ TKXD triển khai sau khi dự án được phê duyệt	CĐT, đơn vị tư vấn	- Từ điều 18 ÷ 25 NĐ số 217. - Điều 12 NĐ số 206.	Mẫu số 13
2	Thẩm định TKXD triển khai sau khi dự án được phê duyệt	CĐT	Điều 29 Luật số 135/2025/QH15	
3	Phê duyệt TKXD triển khai sau khi dự án được phê duyệt Thời gian thẩm định, phê duyệt: 7 ngày	CĐT	- Điều 29 Luật số 135/2025/QH15 - Điều 17 NĐ số 206.	Mẫu số 15
4	Điều chỉnh thiết kế XD triển khai sau khi dự án được phê duyệt		Điều 31 Luật số 135/2025/QH15	

II.2. Trình tự, thủ tục THDA

1. Sơ đồ tổng quát

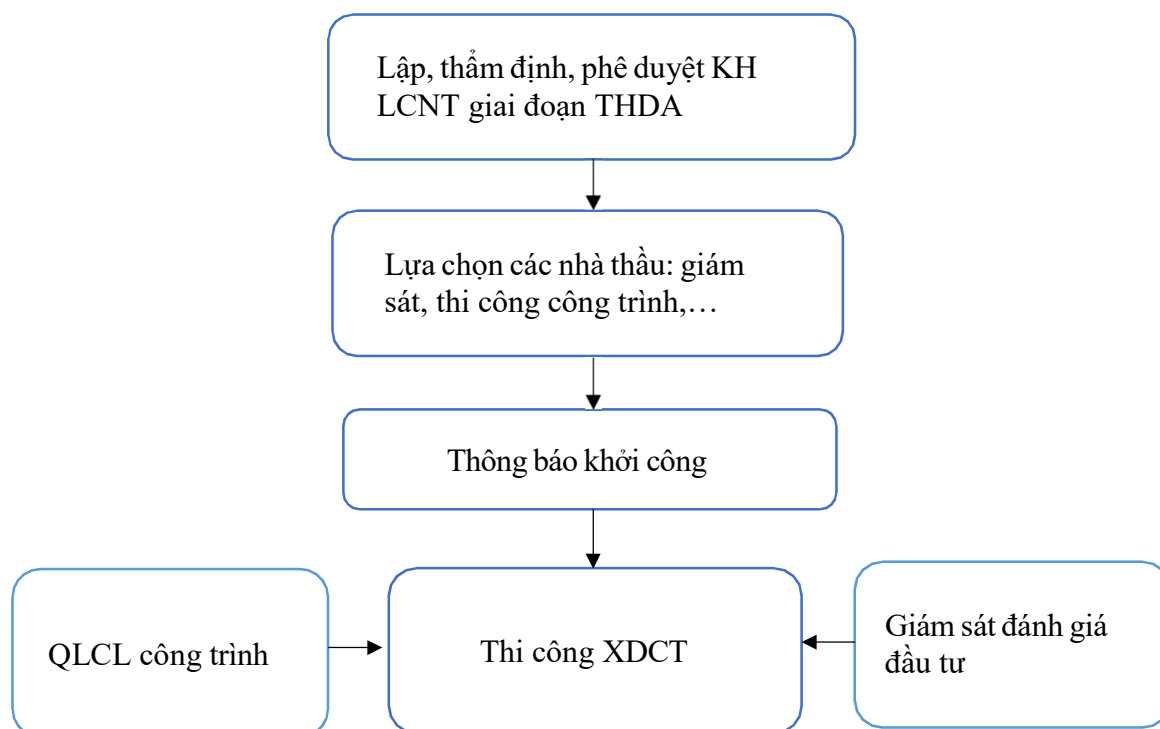

2. Quy trình chi tiết

2.1. Lập, thẩm định, phê duyệt KH LCNT giai đoạn THDA (trường hợp thực hiện bước tại mục 1.1 khoản 1 phần II không trình duyệt KH LCNT tổng thể các gói thầu giai đoạn THDA). Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1.1 khoản 1 phần II.

2.2. Lựa chọn các nhà thầu theo KH LCNT giai đoạn THDA được duyệt. Thực hiện quy trình các bước LCNT theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1.

2.3. Thi công xây dựng công trình:

2.3.1. Thông báo khởi công công trình:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
1	Thông báo về ngày khởi công XD được gửi đến UBND xã, phường; cơ quan QLNN về XD tại địa phương, CQCM về XD.	CĐT	- Điểm đ khoản 1 Điều 48 Luật số 135/2025/QH15. - Điều 12, điều 13 NĐ số 207	Mẫu số 16

2.3.2. Thi công xây dựng, hoàn thành bàn giao công trình.

a. Tổng quát các chủ thể, nội dung và trình tự quản lý

a.1. Các chủ thể và nội dung quản lý

TT	Chủ thể	Nội dung quản lý thi công
1	Nhà thầu thi công Nhà thầu tư vấn giám sát Chủ đầu tư	Chất lượng Tiến độ Khối lượng An toàn lao động Chi phí Quản lý theo hợp đồng
2	Nhà thầu tư vấn thiết kế	Chất lượng Khối lượng

a.2. Trình tự quản lý thi công

TT	Trình tự quản lý	Chủ thể thực hiện
1	Tiếp nhận mặt bằng, quản lý công trường	CĐT Nhà thầu TVTK Nhà thầu TVGS Nhà thầu thi công
2	Quản lý vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng	CĐT Nhà thầu TVTK Nhà thầu TVGS Nhà thầu thi công
3	Quản lý thi công XDCT của nhà thầu	- Nhà thầu thi công
4	Giám sát thi công, kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng	CĐT Nhà thầu TVGS Nhà thầu thi công
5	Giám sát tác giả trong quá trình thi công	- Nhà thầu tư TVTK
6	Nghiệm thu giai đoạn, bộ phận CTXD	CĐT Nhà thầu TVGS

		Nhà thầu thi công
7	Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành	CĐT Nhà thầu tư vấn giám sát Nhà thầu tư vấn thiết kế Nhà thầu thi công
8	Kiểm tra công tác nghiệm thu của CQNN có thẩm quyền	Cơ quan QLNN xây dựng chuyên ngành
9	Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình	Nhà thầu thi công CĐT Nhà thầu tư vấn giám sát Nhà thầu tư vấn thiết kế
10	Hoàn trả mặt bằng	- Nhà thầu thi công
11	Bàn giao công trình xây dựng	CĐT Nhà thầu thi công

b. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong thi công xây dựng công trình

TT	Chủ thể	Quyền và nghĩa vụ
1	Nhà thầu thi công	- Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu quy định tại theo Điều 61 Luật số 135/2025/QH15. Trách nhiệm theo Điều 15 NĐ số 207. - Trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định tại Điều 64 Luật số 135/2025/QH15; Điều 32, điều 33 NĐ số 207.
2	Nhà thầu TVGS	- Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu quy định tại Điều 63 Luật số 135/2025/QH15; - Giám sát thi công xây dựng công trình theo theo Điều 56 Luật số 135/2025/QH15; Điều 20 NĐ 207.
3	Nhà thầu TVTK	- Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng Điều 62 Luật số 135/2025/QH15. - Thực hiện giám sát tác giả theo Điều 21 NĐ số 207.
4	Chủ đầu tư	- Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thi công xây dựng công trình Điều 59 Luật số 135/2025/QH15 - Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc giám sát thi công xây dựng công trình Điều 60 Luật số 135/2025/QH15 Trách nhiệm của CĐT quy định tại Điều 16 NĐ số 207.
5	CQ có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu	- Điều 57 Luật số 135/2025/QH15. - Công trình thực phải thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu; thẩm quyền, nội dung và trình tự kiểm tra theo Điều 26, điều 27 NĐ số 207.

2.3.3. Quản lý chất lượng công trình

2.3.3.1. Giám sát thi công và giám sát tác giả

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
I	Giám sát thi công xây dựng công trình			
1	Nội dung thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình	CĐT và Tổ chức giám sát	- Điều 56 Luật số 135/2025/QH15; - Khoản 1 Điều 20 NĐ số 207.	
2	Phương thức thực hiện giám sát: - CĐT tự thực hiện nếu đủ điều kiện năng lực; - hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực thực hiện	CĐT và Tổ chức giám sát	Khoản 2 Điều 20 NĐ số 207.	
3	Tổ chức giám sát áp dụng loại hợp đồng tổng thầu EPC hoặc hợp đồng chìa khóa trao tay;	CĐT và tổng thầu	Khoản 4 Điều 20 NĐ số 207	
4	- Điều kiện và trách nhiệm của Tổ chức, cá nhân thực hiện GS	CĐT và Tổ chức giám sát		
	- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và có đủ nhân sự thực hiện GS tại công trường.		Khoản 4 Điều 20 NĐ số 207.	
	- Lập báo cáo về công tác GS thi công xây dựng công trình;		Khoản 5 Điều 20 NĐ số 207.	
	- Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo giai đoạn thi công xây dựng			Mẫu số 17
5	-Báo cáo khi tổ chức nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành gói thầu, HMCT, công trình XD			Mẫu số 18
6	Thành lập bộ phận GS thi công xây dựng độc lập với bộ phận trực tiếp thi công XDCT trong trường hợp tổng thầu EPC, tổng thầu theo hình thức chìa khóa trao tay tự thực hiện đồng thời việc GS và thi công XDCT.	CĐT và Tổng thầu	Khoản 6 Điều 20 NĐ số 207	
7	Tính độc lập giữa Tổ chức GS và các nhà thầu thi công, lắp đặt thiết bị và kiểm định CLCT xây dựng và sản phẩm có liên quan đến vật tư, thiết bị do mình cung cấp:	CĐT, Tổ chức giám sát, Tổ chức kiểm định chất lượng	Khoản 5 Điều 20 NĐ số 207.	

8	Trách nhiệm của cơ quan ký kết hợp đồng trong việc tổ chức GS thi công đối với dự án PPP:	CQ ký kết HĐ và DN dự án PPP	Khoản 6 Điều 20 NĐ số 207.	
II	Giám sát tác giả			
1	Trách nhiệm thực hiện GS tác giả của Nhà thầu lập thiết kế XDCT	CĐT, Nhà thầu thiết kế XDCT	Khoản 1 Điều 21 NĐ số 207.	
2	Nội dung thực hiện GS tác giả	Nhà thầu thiết kế XDCT	Khoản 2 Điều 21 NĐ số 207	

2.3.3.2. Kiểm tra công tác nghiệm thu Công trình xây dựng


TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
I	Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công			
1	Thông báo cho CĐT kế hoạch kiểm tra. - Thực hiện kiểm tra không quá 03 lần đối với công trình cấp đặc biệt và công trình cấp I; không quá 02 lần đối với các công trình còn lại. <i>(Từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình)</i> - Nội dung kiểm tra: Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác QLCL, an toàn trong thi công XDCT của CĐT và các nhà thầu tham gia.	CQ chuyên môn về XD	- Điều 57 Luật XD năm 2025 - Các Điều 25, 27 NĐ số 207.	
2	Tổ chức kiểm tra, ra văn bản thông báo KQKT gửi CĐT. * Theo quy định: - Không quá 14 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt; - Không quá 7 ngày đối với các công trình còn lại. <i>(Kể từ ngày tổ chức kiểm tra)</i> * Phấn đấu thực hiện: - Không quá 10 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt; - Không quá 5 ngày đối với các công trình còn lại. <i>(Kể từ ngày tổ chức kiểm tra)</i>	CQ chuyên môn về XD	Các Điều 25, 27 NĐ số 207.	
II	Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình			

1	Gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu tới CQ Chuyên môn về XD. - Trước 15 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I; - Trước 10 ngày đối với công trình còn lại. (So với ngày dự kiến tổ chức nghiệm thu hoàn thành CT)	CĐT	Các Điều 25, 27 NĐ số 207.	Mẫu số 19
2	Kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành CT	CQ chuyên môn về XD	Các Điều 25, 27 NĐ số 207	
3	Ra văn bản chấp thuận KQ nghiệm thu của CĐT hoặc ra văn bản không chấp thuận KQ nghiệm thu của CĐT; trong đó nêu rõ các nội dung còn tồn tại cần được khắc phục. * Theo quy định: - Không quá 30 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt; - Không quá 20 ngày đối với công trình còn lại. * Phấn đấu thực hiện: - Không quá 25 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I; - Không quá 15 ngày đối với công trình còn lại.	CQ chuyên môn về XD	Các Điều 25, 27 NĐ số 207.	Mẫu số 20

2.4. Trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư; điều chỉnh thiết kế - dự toán công trình

2.4.1. Điều chỉnh dự án đầu tư (BCNCKT, BCKTKT).

a. Sơ đồ tổng quát

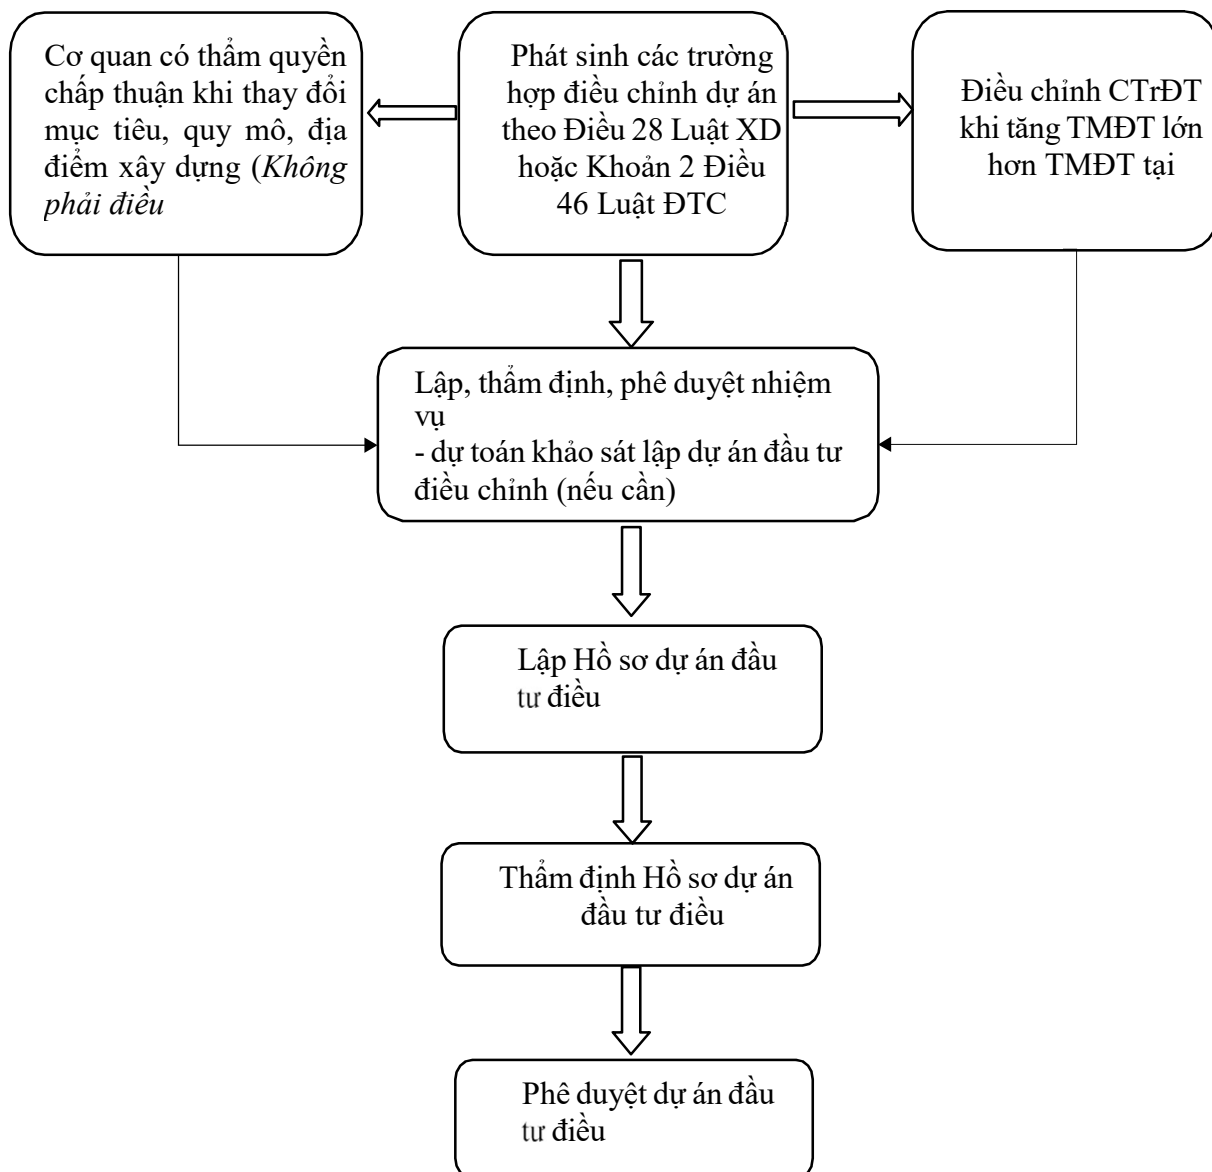


b. Quy trình chi tiết

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
I	Dự án có cấu phần xây dựng			
1	Xác định trường hợp phải điều chỉnh dự án ĐTXD	CĐT, Đơn vị TVTK, đơn vị TVGS, đơn vị thi công (nếu có)	- Điều 28 Luật XD năm 2025; - Khoản 2 Điều 46 Luật ĐTC số 58;	
1.1	Điều chỉnh CTrĐT; Trường hợp thay đổi một trong các nội dung về mục tiêu, địa điểm, vượt mức vốn đầu tư công so với mức vốn đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chương trình, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chương trình, dự án.	CĐT, CQ chuyên môn quản lý ĐTC, Cơ quan có thẩm quyền	Khoản 22 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15	
1.2	Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận khi thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng (<i>Không phải điều chỉnh CTrĐT</i>)	CĐT, CQ chuyên môn về xây dựng, người có TQ	Khoản 2 Điều 28 Luật XD năm 2025	CĐT trình chủ trương điều chỉnh DA
2	- Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ - dự toán khảo sát lập dự án ĐTXD điều chỉnh (nếu cần); - Điều chỉnh KH LCNT, HĐ tư vấn (nếu cần).	CĐT, Đơn vị tư vấn	Khoản 1, 2 Điều 10 NĐ số 206	
3	Lập Hồ sơ dự án ĐTXD điều chỉnh	CĐT, Đơn vị tư vấn		
4	Thẩm định Hồ sơ dự án ĐTXD điều chỉnh	Sở quản lý XD chuyên ngành/Phòng KT, HT&ĐT cấp xã	- Nội dung TĐ của CQ chuyên môn về XD theo các Điều 32, 33, 35, 36 và 37 NĐ số 217 đối với các trường hợp tại Khoản 2 Điều 40 NĐ số 217. - Nội dung TĐ của người quyết định đầu tư theo Điều 31 NĐ số	

			217.	
5	Phê duyệt điều chỉnh dự án	Người quyết định đầu tư	Khoản 3 Điều 46 Luật số 58/2024/QH15	
II. Dự án không có cấu phần xây dựng				
1	Xác định các trường hợp được thực hiện điều chỉnh dự án	CĐT	Khoản 2 Điều 46 Luật số 58/2024/QH15	
2	Thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án	Người có TQ	Khoản 3 Điều 46 Luật số 58/2024/QH15	
3	Điều chỉnh CTrĐT trước khi điều chỉnh DA, trong trường hợp thay đổi một trong các nội dung về mục tiêu, địa điểm, vượt mức vốn đầu tư công, vượt mức vốn đầu tư công của ngân sách cấp trên, vượt TMĐT dự án so với TMĐT đã được cấp có thẩm quyền quyết định CTrĐT	CĐT, CQ chuyên môn quản lý ĐTC, Người/Cấp có TQ	- Khoản 22 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15 - Khoản 4 Điều 25 NĐ số 85.	
4	Trình tự, thủ tục thẩm định, quyết định điều chỉnh dự án	CĐT, CQ chuyên môn quản lý ĐTC, Người có TQ	- Khoản 2 Điều 43 Luật số 58/2024/QH15; - Điểm a Khoản 3 Điều 25 NĐ số 85;	

2.4.2. Điều chỉnh thiết kế - dự toán

a. Sơ đồ tổng quát

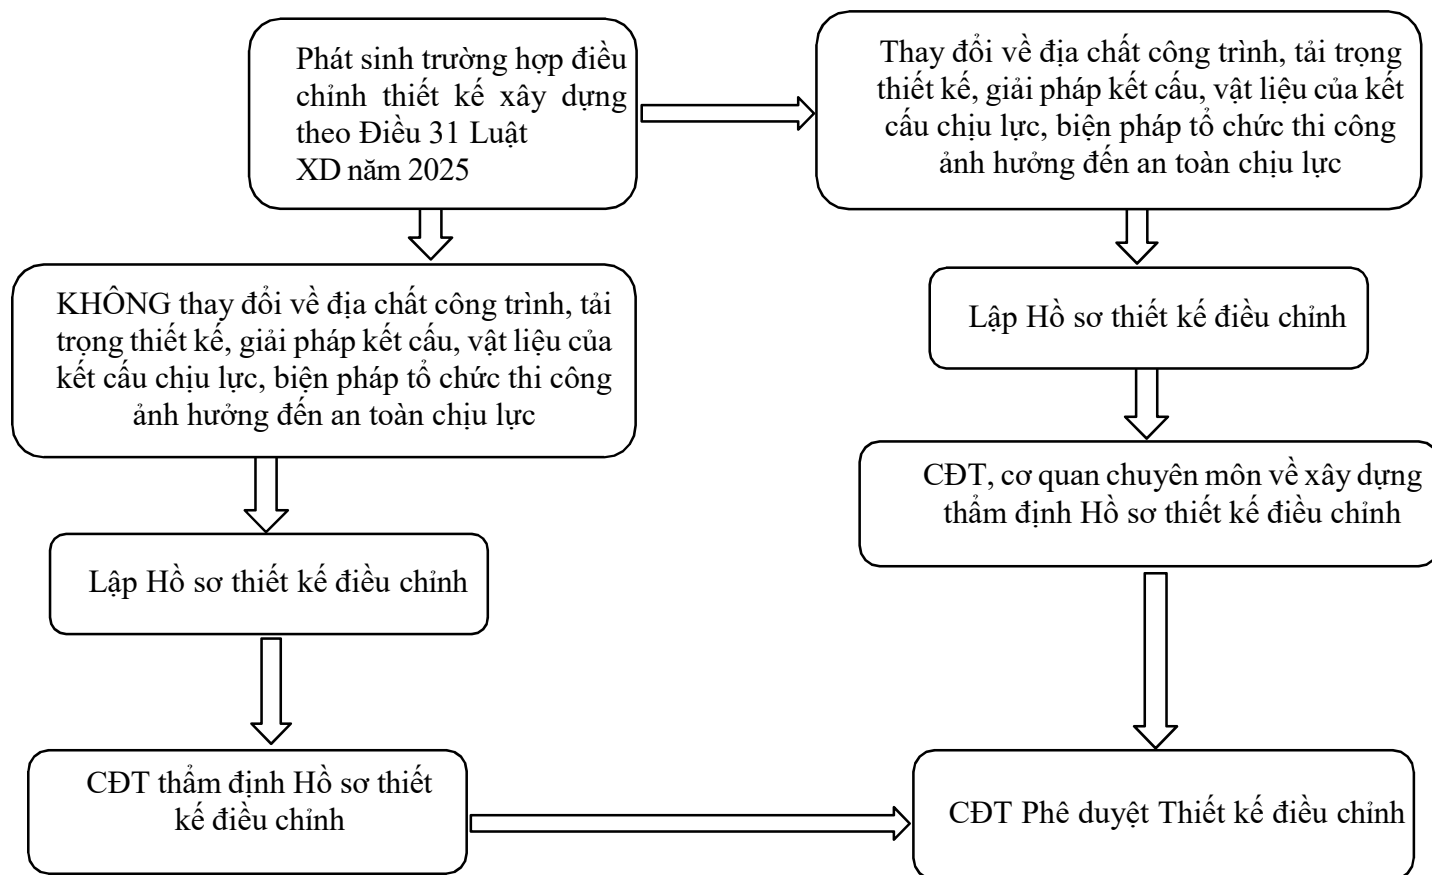

b. Quy trình chi tiết

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
1	Lập nhiệm vụ KS,TK xây dựng điều chỉnh, bao gồm dự toán (nếu có)	CĐT, Đơn vị tư vấn	Các Điều 11, 15 và 17 NĐ số 217.	
2	Phê duyệt nhiệm vụ KS,TK xây dựng điều chỉnh, bao gồm cả dự toán (nếu có)	CĐT	- Các Điều 11, 15 và 17 NĐ số 217. - Các Điều 16, 17, 18 NĐ số 206.	
3	Điều chỉnh KH LCNT, hợp đồng tư vấn (nếu cần)	CĐT, Đơn vị tư vấn	- Điểm b khoản 22 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15	
4	Lập Hồ sơ thiết kế điều chỉnh	CĐT, đơn vị tư vấn	- Các Điều 19, 20 Luật XD năm 2025; - Các Điều 18, 20, 21, 22 và 23 NĐ số 217; - Các Điều 12, 13, 14 NĐ số 206.	

5	Thẩm định thiết kế điều chỉnh	CĐT	Điều 29 Luật XD năm 2025	CĐT có trách nhiệm tổng hợp KQ thẩm định của CQ chuyên môn về XD
5.1.	Trường hợp thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực			
a)	Công tác thẩm định của CĐT	CĐT	Điều 30 Luật XD năm 2025.	
b)	Công tác thẩm định của Cơ quan chuyên môn về xây dựng Theo quy định: - Không quá 60 ngày đối với dự án quan trọng quốc gia; - Không quá 25 ngày làm việc đối với dự án nhóm A có công trình cấp I trở lên; không quá 20 ngày làm việc đối với các dự án nhóm A còn lại; - Không quá 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm B có công trình cấp I trở lên; không quá 16 ngày làm việc đối với các dự án nhóm B còn lại; - Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm C có công trình cấp I trở lên; không quá 12 ngày làm việc đối với các dự án nhóm C còn lại.	Sở quản lý XD công trình chuyên ngành/ Phòng KT, HT&ĐT xã, phường	Điều 41 NĐ số 217.	Các mẫu số 13, mẫu số 14
5.2.	Trường hợp KHÔNG thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực			
a)	Công tác thẩm định của CĐT	CĐT	Điều 30 Luật XD năm 2025	
6	Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS điều chỉnh	CĐT	- Điều 29 Luật XD năm 2025; - Điều 42 NĐ số 217; - Các Điều 16, 17, 18 NĐ số 206.	Mẫu số 15

III. Kết thúc dự án


1. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng (Đã được mô tả tại Phần II biểu của mục 2.3.3.2. Kiểm tra công tác nghiệm thu thi công xây dựng công trình).

2. Bàn giao công trình xây dựng đưa vào sử dụng

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
1	Bàn giao các tài liệu gồm bản vẽ hoàn công, quy trình hướng dẫn vận hành, quy trình bảo trì công trình, danh mục các TB, phụ tùng, vật tư dự trữ thay thế và các tài liệu cần thiết khác có liên quan.	Chủ đầu tư, Các nhà thầu thi công XDCT	Điều 58 Luật XD năm 2025	
	*Lập bản vẽ hoàn công		Phụ lục IIb tại NĐ số 207.	

3. Trình tự, thủ tục quyết toán dự án hoàn thành

a. Sơ đồ tổng quát

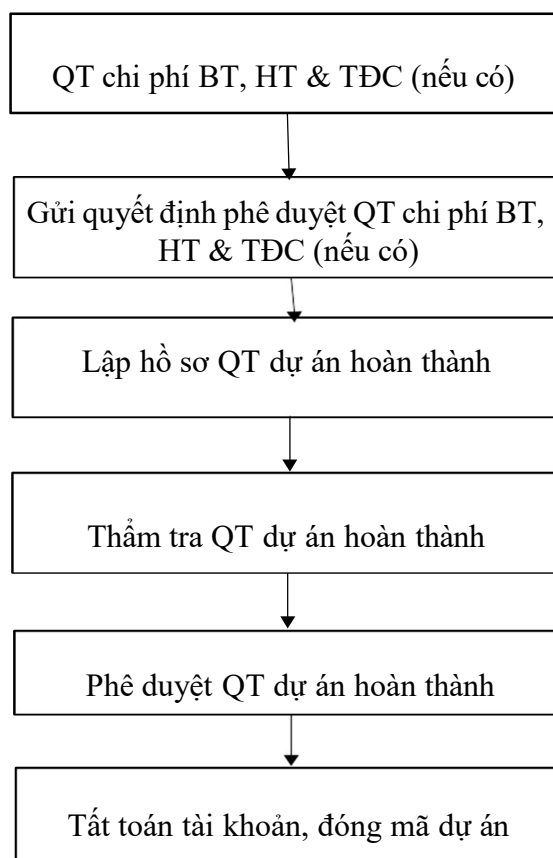

b. Quy trình chi tiết.

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
Bước 1: Quyết toán chi phí BT, HT & TĐC (nếu có)				
1	Tổ chức làm nhiệm vụ BT, GPMB báo cáo QT chi phí BT, HT & TĐC trình Chủ tịch UBND cùng cấp với cấp có TQ phê duyệt DA BT, HT& TĐC để phê duyệt QT chi phí BT, HT&TĐC cư hoàn thành	Tổ chức làm nhiệm vụ BT, GPMB; Chủ tịch UBND cấp xã	Khoản 3 Điều 5 NĐ số 193	
Bước 2: Gửi quyết định phê duyệt QT chi phí BT, HT & TĐC (nếu có)				
1	Tổ chức làm nhiệm vụ BT, GPMB gửi QĐ phê duyệt tới CĐT dự án ĐTXD công trình để tổng hợp vào báo cáo QT vốn ĐTC dự án hoàn thành chung của toàn bộ DA.	Tổ chức làm nhiệm vụ BT, GPMB; CĐT	Khoản 3 Điều 5 NĐ số 193.	
Bước 3: Lập hồ sơ QT dự án hoàn thành				
1	Lập hồ sơ QT DA hoàn thành (Thời gian tối đa theo quy định): - DA QTQG: 09 tháng; - DA nhóm A: 09 tháng; - DA nhóm B: 06 tháng; - DA nhóm C: 04 tháng.	CĐT; các nhà thầu	Điều 21 NĐ số 193;	Các mẫu từ mẫu số 32 đến mẫu số 49
2	LCNT kiểm toán để kiểm toán báo cáo QT dự án hoàn thành (bắt buộc đối với DA nhóm A); dự án nhóm B, C - việc thực hiện kiểm toán báo cáo QT do Người quyết định đầu tư quyết định.	CĐT	- Luật đấu thầu năm 2023; - NĐ số 214; - Điều 9 NĐ số 193.	
Bước 4: Thẩm tra QT dự án hoàn thành				
1	Tiếp nhận hồ sơ và chủ trì thẩm tra QT (Thời gian tối đa theo quy định): - DA QTQG: 04 tháng; - DA nhóm A: 04 tháng; - DA nhóm B: 2,5 tháng; - DA nhóm C: 02 tháng.	Sở TC/Phòng kinh tế cấp xã	Điều 21 NĐ số 193	Các mẫu từ mẫu số 32 đến mẫu số 49

Bước 5: Phê duyệt QT dự án hoàn thành				
1	Thẩm quyền phê duyệt QT:			
-	Dự án hoặc DA thành phần	Chủ tịch UBND tỉnh/Chủ tịch UBND cấp xã	Điều 8 NĐ số 193	
-	Dự án nhóm A	Chủ tịch UBND tỉnh	Điều 8 NĐ số 193	
-	Dự án nhóm B, C	Chủ tịch UBND tỉnh/Chủ tịch UBND cấp xã		
2	Hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt QT	Sở TC/Phòng kinh tế cấp xã	Điều 7 NĐ số 193	
3	Phê duyệt QT dự án hoàn thành: *Thời gian tối đa theo quy định: Dự án QTQG: 15 ngày; Dự án nhóm A: 15 ngày; Dự án nhóm B: 10 ngày; Dự án nhóm C: 07 ngày;	Người có TQ phê duyệt QT	Điều 21 NĐ số 193	
Bước 6: Tắt toán tài khoản, đóng mã dự án đầu tư XDCB				
1	a. Điều kiện tắt toán TK, đóng mã dự án: - Các DA đã được phê duyệt QT hoàn thành, đã hoàn thành thủ tục TT công nợ phải thu, phải trả; DA đã được thu hồi hết số dư tạm ứng theo chế độ quy định. - TK tắt toán khi số dư của TK bằng 0. b. Hồ sơ tắt toán TK: - Văn bản của CĐT, BQLDA đề nghị tắt toán TK - Bảng đối chiếu DT và tình hình sử dụng kinh phí NSNN hoặc bảng xác nhận số dư TK tiền gửi	CĐT, BQLDA	- Điều 10 TT số 157; - Điều 9 NĐ số 347	
2	- Đối chiếu số liệu, xác nhận số dư và thực hiện tắt toán TK cho đơn vị - Gửi thông báo tắt toán tài	KBNN	NĐ số 347; TT số 157.	

	khoản của KB cho CĐT, BQLDA - Hàng năm lập Bảng thống kê các đơn vị có quan hệ với NS ngừng hoạt động gửi CQTC chính đồng cấp làm thủ tục đóng mã DA.			
3	STC thực hiện đóng mã DA	STC	TT số 157	

4. Bảo hành, bảo trì công trình xây dựng

4.1. Bảo hành công trình xây dựng

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
1	Trách nhiệm bảo hành CTXD	Các nhà thầu thi công, cung ứng TB	- Khoản 1 Điều 64 Luật XD năm 2025; - Các Điều 32, 33 NĐ số 207.	
2	Nội dung bảo hành		Khoản 2 Điều 64 Luật XD năm 2025	
3	Thời gian bảo hành		- Khoản 3 Điều 64 Luật XD năm 2025 - Điều 32 NĐ số 207.	

4.2. Bảo trì công trình xây dựng

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
1	Lập và phê duyệt quy trình bảo trì CTXD	Nhà thầu TKXD; Nhà thầu cung cấp, lắp đặt TB; CĐT; Chủ sở hữu/Người QLSD CT	- Điều 65 Luật XD năm 2025; Điều 34 NĐ số 207.	
2	Lập kế hoạch và DT kinh phí bảo trì CTXD	Chủ sở hữu/Người QLSD CT	Điều 35 NĐ số 207	
3	Thực hiện bảo trì và QLCL công việc bảo trì.	Chủ sở hữu/ Người QLSD CT	- Điều 65 Luật XD năm 2025; - Điều 36 NĐ số 207.	
4	Đánh giá an toàn công trình.	UBND tỉnh; Tổ chức đánh giá an toàn CT; Chủ sở hữu/ Người QLSD CT	- Khoản 4, 5 Điều 65 Luật XD năm 2025; - Các Điều 40, 41 NĐ số 207.	
5	Lập và quản lý hồ sơ bảo trì CTXD	CĐT; Chủ sở hữu/Người QLSD CT	Khoản 1 Điều 38 NĐ số 207.	

5. Xử lý tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án

5.1. Đối với tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án không xác định cụ thể đối tượng thụ hưởng trong dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
1	Dự án không xác định cụ thể đối tượng thụ hưởng tài sản, việc xử lý tài sản sau khi dự án kết thúc được thực hiện theo các hình thức sau đây: Điều chuyển; Bán; Thanh lý; Giao doanh nghiệp quản lý, sử dụng; Hình thức khác theo quy định của pháp luật.	BQLDA, Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh, đối tượng thụ hưởng	- Điều 104 của Luật QLSDTSC năm 2017 - Điều 42, 43 và Điều 45 của Luật QLSDTSC năm 2017 - Điều 90, 91, 92 và khoản 2 Điều 93 NĐ số 186	

5.2. Đối với tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án mà đối tượng thụ hưởng kết quả dự án đã được xác định cụ thể trong dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt


TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
1	Trong thời hạn 60 ngày (đối với công trình xây dựng), 30 ngày (đối với tài sản khác), kể từ ngày hoàn thành việc đầu tư xây dựng, mua sắm, Ban Quản lý dự án có trách nhiệm bàn giao tài sản cho đối tượng thụ hưởng để đưa vào khai thác, sử dụng theo mục tiêu dự án	BQLDA, đối tượng thụ hưởng	- Điểm a khoản 1 Điều 93 NĐ số 186	
2	Việc hạch toán, quản lý tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án sau khi bàn giao	Đối tượng thụ hưởng	- Điểm b khoản 1 Điều 93 NĐ số 186	
3	Việc xác định nguyên giá tài sản cố định để hạch toán được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định tại cơ quan nhà nước; chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.	Đối tượng thụ hưởng	- Điểm c khoản 1 Điều 93 NĐ số 186	

PHẦN B
CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO

Phụ lục 1**QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

1. Quy trình chỉ định thầu rút gọn (trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện gói thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu).

a. Sơ đồ tổng quát

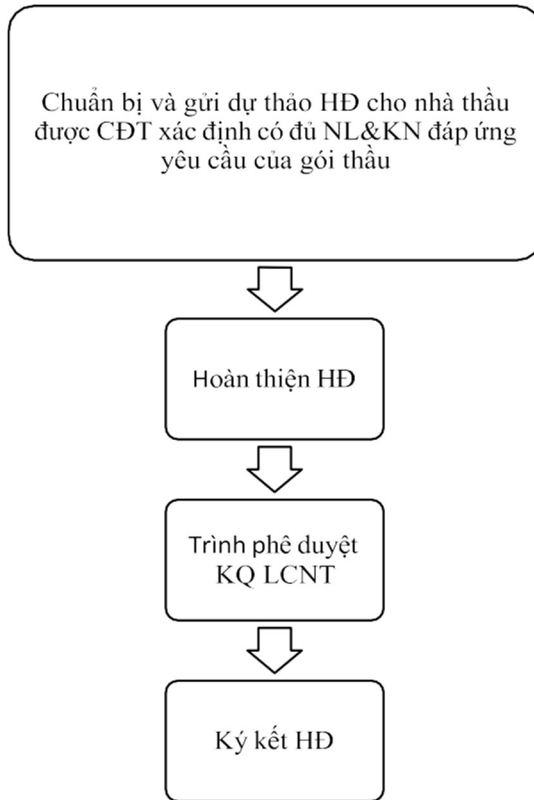


b. Quy trình chi tiết

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
1	Chuẩn bị và gửi dự thảo HĐ cho nhà thầu được CĐT xác định có đủ NL&KN đáp ứng yêu cầu của gói thầu	BMT	Điểm a Khoản 3 Điều 80 NĐ số 214	
2	Hoàn thiện HĐ	BMT và nhà thầu	Điểm b Khoản 3 Điều 80 NĐ số 214	
3	Trình, phê duyệt KQLCNT Công khai kết quả chỉ định thầu trên Hệ thống mạng ĐTQG	CĐT CĐT	- Điểm b Khoản 3 Điều 80 NĐ số 214 - Khoản 2 Điều 23 Luật số 22/2023/QH15	

4	Ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng	CĐT và nhà thầu	Khoản 2 Điều 23 Luật số 22/2023/QH15 - Điểm c Khoản 3 Điều 80 ND số 214; - ND số 210	
---	--------------------------------------	-----------------	--	--

2. Quy trình chỉ định thầu thông thường (Việc chỉ định thầu phải được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày)

a. Sơ đồ tổng quát

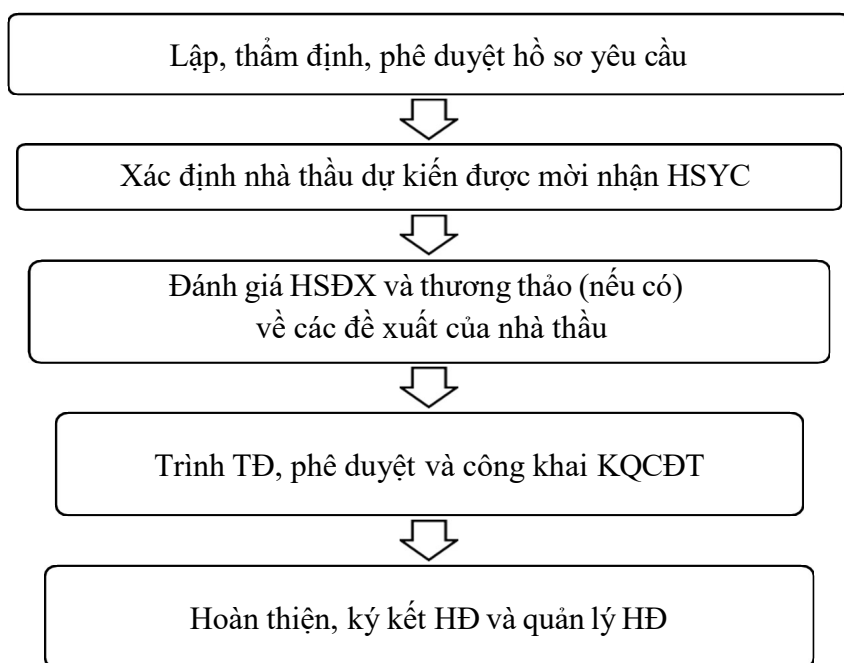


b. Quy trình chi tiết

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
Bước 1: Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu				
1	Nội dung hồ sơ yêu cầu; Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật	BMT, CĐT	Điểm a Khoản 3 Điều 79 ND số 214	
Bước 2: Xác định nhà thầu dự kiến được mời nhận hồ sơ yêu cầu				
1	Phát hành HSYC	BMT	- Điểm b Khoản 3 Điều 79 ND số 214	
2	Chuẩn bị và nộp HSDX	Nhà thầu	- Điểm c Khoản 3 Điều 79 ND số 214	
Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu				

1	Đánh giá HSDX và thương thảo (nếu có) các đề xuất của nhà thầu	BMT và nhà thầu	Điểm c Khoản 3 Điều 79 NĐ số 214	
Bước 4: Thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu				
1	Việc phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu	CĐT	- Điểm d Khoản 3 Điều 79 NĐ số 214 - Điều 33 NĐ số 214.	
Bước 5: Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng				
1	Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện HĐ	CĐT và nhà thầu	- Các điều 34, 35 NĐ số 214. - Điểm đ Khoản 3 Điều 79 NĐ số 214. - NĐ số 210.	

3. Quy trình chào hàng cạnh tranh

a. Sơ đồ tổng quát

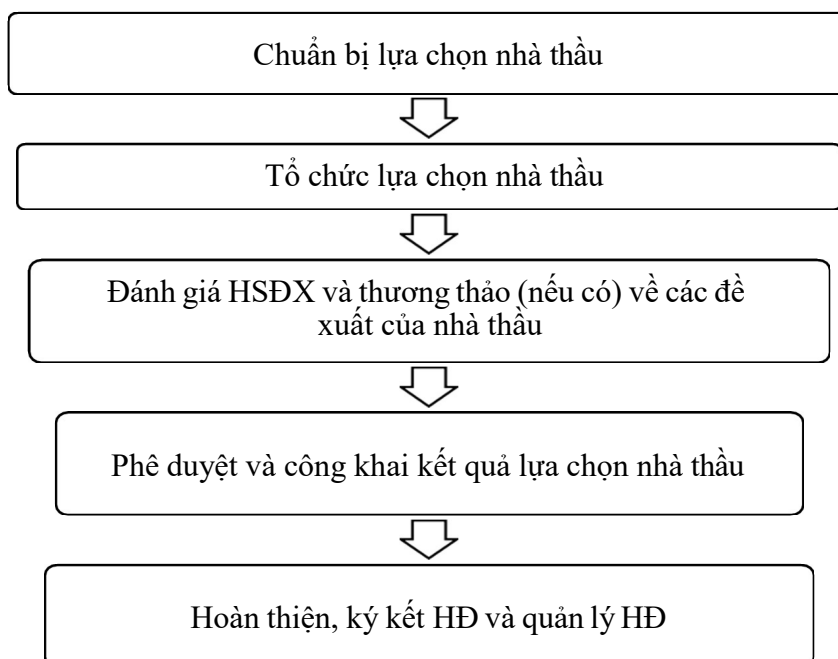


b. Quy trình chi tiết

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
Bước 1: Chuẩn bị LCNT				
1	Lập hồ sơ mời thầu	BMT, CĐT	Điểm a Khoản 1 Điều 81 NĐ số 214	
2	Phê duyệt hồ sơ mời thầu	BMT, CĐT	Điểm b Khoản 1 Điều 81 NĐ số 214	
Bước 2: Tổ chức LCNT				

1	Đăng tải thông báo mời thầu và hồ sơ mời thầu	BMT, CĐT	Điểm a Khoản 2 Điều 81 NĐ số 214	
2	Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu	BMT, CĐT	Điểm b Khoản 2 Điều 81 NĐ số 214	
3	Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu	Nhà thầu	Điểm c Khoản 2 Điều 81 NĐ số 214	
4	Mở thầu	CĐT	Điểm d Khoản 2 Điều 81 NĐ số 214	
Bước 3: Đánh giá Hồ sơ đề xuất và thương thảo (nếu có) về các đề xuất của nhà thầu				
1	Đánh giá HSĐX và thương thảo (nếu có) các đề xuất của nhà thầu	BMT và nhà thầu	Khoản 3 Điều 81 NĐ số 214	
Bước 4: Phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu/chào hàng cạnh tranh				
1	Phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn thầu	CĐT	Khoản 4 Điều 81 NĐ số 214	
Bước 5: Hoàn thiện, ký kết HĐ và quản lý HĐ				
1	Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện HĐ	CĐT và nhà thầu	- Khoản 4 Điều 81 NĐ số 214. - Các điều 34,35 NĐ số 214. - NĐ số 210.	

4. Quy trình mua sắm trực tiếp

a. Sơ đồ tổng quát

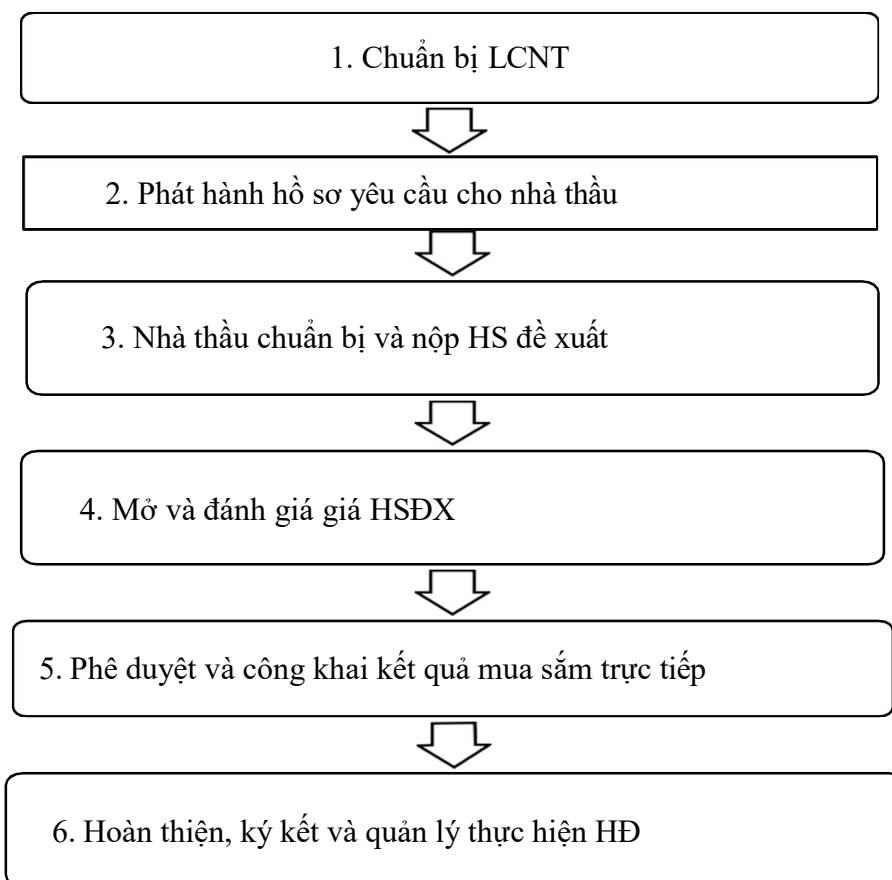


b. Quy trình chi tiết

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
Bước 1: Chuẩn bị LCNT				
1	Lập hồ sơ yêu cầu	BMT,CĐT	Điểm a Khoản 2 Điều 82 ND số 214	
2	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu	BMT,CĐT	Điểm b Khoản 2 Điều 82 ND số 214	
Bước 2: Phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu				
1	Phát hành Hồ sơ yêu cầu	BMT,CĐT	Khoản 3 Điều 82 ND số 214	
Bước 3: Nhà thầu chuẩn bị và nộp HS đề xuất				
1	Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu	Nhà thầu	Khoản 3 Điều 82 ND số 214	
Bước 4: Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu				

1	Đánh giá hồ sơ đề xuất	CĐT	Khoản 5 Điều 82 NĐ số 214	
Bước 5: Phê duyệt và công khai kết quả mua sắm trực tiếp				
1	Phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn thầu	CĐT	Khoản 6 Điều 82 NĐ số 214	
Bước 6: Hoàn thiện, ký kết HĐ và quản lý HĐ				
1	Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện HĐ	CĐT và nhà thầu	Khoản 7 Điều 82 NĐ số 214. - Các điều 34,35 NĐ số 214. - NĐ số 210.	

5. Quy trình tự thực hiện

a. Sơ đồ tổng quát

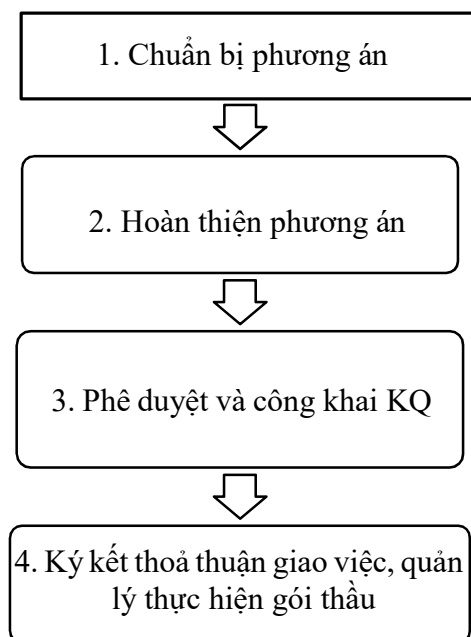


b. Quy trình chi tiết

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
Bước 1: Chuẩn bị phương án tự thực hiện và dự thảo thỏa thuận giao việc				
1	Lập Phương án tự thực hiện	CĐT và đơn vị được giao	Khoản 1 Điều 83 NĐ số 214	
Bước 2: Hoàn thiện phương án tự thực hiện				
1	Chủ đầu tư và đơn vị được giao thực hiện gói thầu thương thảo	CĐT và đơn vị được giao	Khoản 2 Điều 83 NĐ số 214	
Bước 3: Phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu				

1	Phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu	CĐT và đơn vị được giao	Khoản 3 Điều 83 NĐ số 214	
Bước 4: Ký kết thỏa thuận giao việc, quản lý việc thực hiện gói thầu				
1	Ký kết thỏa thuận giao việc, quản lý việc thực hiện gói thầu	CĐT và đơn vị được giao	Khoản 4 Điều 83 NĐ số 214	

6. Quy trình Đấu thầu rộng rãi, hạn chế không qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Điều 30 Luật; các điều từ điều 24÷35 NĐ 214)

a. Sơ đồ tổng quát

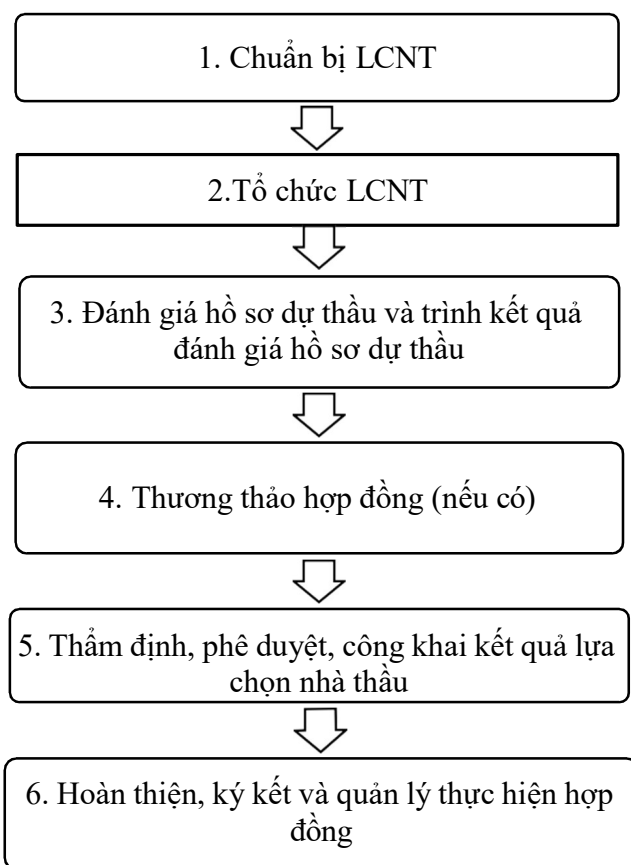

b. Quy trình chi tiết

b1. Quy trình lựa chọn danh sách ngắn

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
a) Lựa chọn danh sách ngắn đối với đấu thầu rộng rãi				
1	Lập HSMST	BMT	Điểm a Khoản 1 Đ25 NĐ số 214	
2	Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển	BMT, CĐT	Điểm b Khoản 1 Đ25 và Điều 135 NĐ số 214	
3	Thông báo MST	BMT	Điểm c Khoản 1 Đ25 NĐ số 214 - Điểm b Khoản 1 Điều	

			8 Luật đấu thầu 2023	
4	Phát hành HSMST		Điểm d Khoản 1 Đ25 NĐ số 214	
5	Tiếp nhận và quản lý HSDST	BMT	Điểm đ Khoản 1 Đ25 NĐ số 214	
6	Mở và đánh giá HSDST	BMT	Điểm e Khoản 1 Đ25 NĐ số 214	
7	Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển	BMT, CĐT	Điểm g Khoản 1 Đ25 NĐ số 214	
8	Công khai danh sách ngắn	CĐT, BMT	- Điểm h Khoản 1 Điều 23 NĐ số 214 - Điểm b Khoản 1 và Khoản 4 Điều 8 của Luật Đấu thầu 2023	
b) Lựa chọn danh sách ngắn đối với đấu thầu hạn chế				
1	Xác định, phê duyệt danh sách ngắn	CĐT	Điểm a Khoản 2 Đ25 NĐ số 214	
2	Đăng tải danh sách ngắn	CĐT, BMT	- Điểm b Khoản 2 Đ25 NĐ số 214 - Điểm b Khoản 1 và Khoản 4, Điều 8 của Luật Đấu thầu 2023.	

b2. Quy trình chi tiết đấu thầu rộng rãi, hạn chế không qua mạng


TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Điều, khoản áp dụng	Ghi chú
Bước 1: Chuẩn bị LCNT				
1	Lựa chọn danh sách ngắn (nếu cần, Người có thẩm quyền quyết định và phải được ghi trong KH LCNT)	BMT, CĐT	- Điểm a Khoản 1 Đ24 NĐ số 214; - Điều 25 NĐ số 214;	
2	Lập HSMT	BMT	- Điều 26 NĐ số 214; - Điều 4 TT số 79	
3	Thẩm định và phê duyệt HSMT: Chủ đầu tư không bắt buộc phải thẩm định hồ sơ mời thầu; trường hợp có yêu cầu thẩm định thì thực hiện theo quy định tại Điều 135 của Nghị định 214/2025/NĐ, trước khi phê duyệt			
Bước 2: Tổ chức LCNT				

1	Thông báo mời thầu được áp dụng đối với trường hợp không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn (thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu)	BMT	- Điểm b Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu 2023 - Điểm a Khoản 1 Đ28 NĐ số 214; - Các Điều 14, 15 TT số 79	
	Thông báo mời thầu áp dụng đối với gói thầu áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn (thư mời thầu được gửi đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn)		- Điểm b, Khoản 1, Đ28 NĐ số 214 - Các Điều 14, 15 TT số 79	
2	Phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMT	BMT	- Khoản 2 Đ28 NĐ số 214; - Đ15 TT số 79;	
3	Chuẩn bị HSDT, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút HSDT	Nhà thầu	- Khoản 3 Đ28, NĐ số 214; - Điều 14, Đ15 TT số 79.	
4	Mở thầu:	BMT, Nhà thầu	- Khoản 4 Điều 28 NĐ số 214; - Điều 29 TT số 79.	
Bước 3: Đánh giá HSDT				
1	Làm rõ HSDT	BMT, Nhà thầu	Điều 29, Đ30 NĐ số 214	
2	Sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch	Nhà thầu, BMT	Điều 29, Đ31 NĐ số 214	
3	Kiểm tra tính hợp lệ của HSDT	Tổ chuyên gia đấu thầu	Điều 29, Khoản 1 Đ32 NĐ số 214	
4	Đánh giá tính hợp lệ của HSDT	Tổ chuyên gia đấu thầu	Điều 29, Khoản 2 Đ32 NĐ số 214	
5	Đánh giá về NLKN	Tổ chuyên gia đấu thầu	Điều 29, Khoản 3 Đ32 NĐ số 214	
6	Đánh giá về kỹ thuật và tài chính	Tổ chuyên gia đấu thầu	Điều 29, Khoản 4 Đ32 NĐ số 214	
7	Báo cáo đánh giá HSDT	Tổ chuyên gia đấu thầu	- Điều 27, Khoản 5 Đ32; Đ33 NĐ số 214; - Điều 4 TT số 79.	
8	Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả LCNT	BMT, CĐT	- Đ27, Đ31 NĐ số 214; - Đ4 TT số 22.	

Bước 4: Hoàn thiện, ký kết hợp đồng				
1	TB mời nhà thầu trúng thầu đến hoàn thiện Hợp đồng	CĐT, BMT, Nhà thầu trúng thầu	Khoản 1 Điều 34 NĐ số 214	
2	Ký kết Hợp đồng	CĐT và nhà thầu	- Khoản 2 Điều 34 NĐ số 214; - Điều 4 TT số 79	
Bước 5: Quản lý thực hiện Hợp đồng				
1	Quản lý thực hiện Hợp đồng	CĐT và nhà thầu	- Khoản 1,2, 3 Điều 35 NĐ số 214; - NĐ số 210	

7. Quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (Điều 31 Luật Đấu thầu; các điều từ điều 36÷46 NĐ 214).

a) Sơ đồ tổng quát

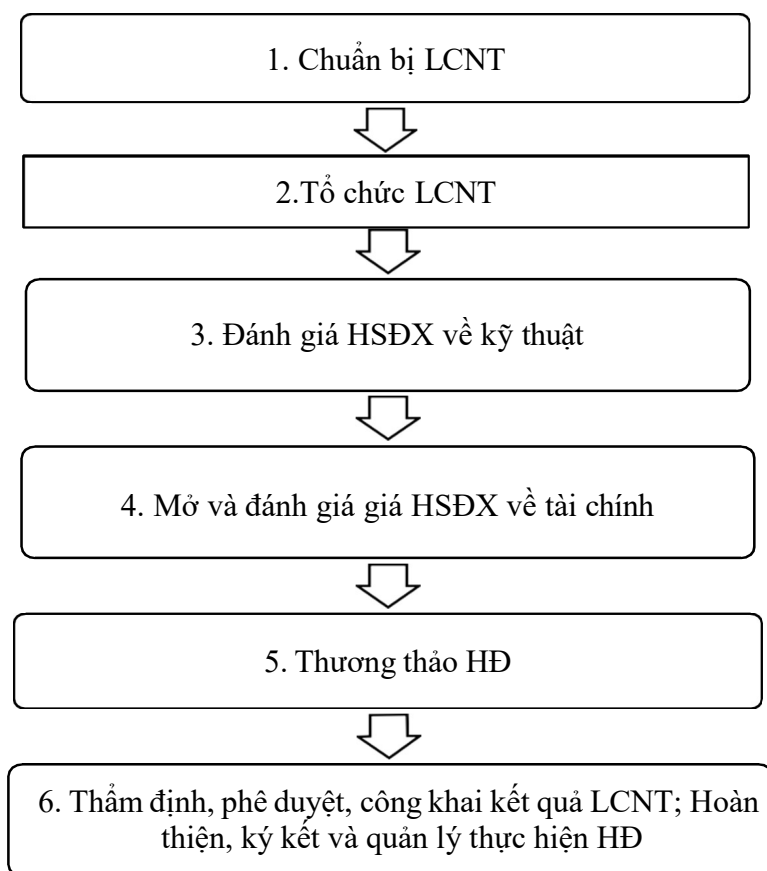

b) Quy trình chi tiết:

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
Bước 1: Chuẩn bị LCNT				
1	Lựa chọn DS ngắn (nếu cần thiết)	BMT	- Điểm a Khoản 1 Điều 36 NĐ số 214; - Các Điều 14, 15 TT số 79	
2	Lập HSMT	BMT	- Điều 37, 38 NĐ số 214; - Điều 4 TT số 79.	
3	Thẩm định và phê duyệt HSMT	Đơn vị thẩm định, BMT và CĐT	- Điều 39, Điều 135 NĐ số 214. - Điều 4, 26 TT số 79.	
Bước 2: Tổ chức LCNT				
1	Thông báo mời thầu được áp dụng đối với trường hợp không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn (thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu năm 2023)	BMT	- Điểm b Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu 2023 - Điểm a Khoản 1 Điều 40 NĐ số 214; - Điều 17 TT số 79	
	Thông báo mời thầu áp dụng đối với gói thầu áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn (thư mời thầu được gửi đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn)		- Điểm b, Khoản 1, Điều 40 NĐ số 214 - Điều 17 TT số 79	
2	Phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMT	BMT	- Khoản 2 Điều 28 và Khoản 2 Điều 40 NĐ số 214; - Điều 18 TT số 79.	
3	Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút HSDT	Nhà thầu, BMT	Khoản 3, Điều 40 NĐ số 214; - Điều 18 TT số 79.	
4	Mở HSDX về kỹ thuật	BMT, các nhà thầu	- Khoản 4 Điều 40 NĐ số 214; - Điều 29 TT số 79;	
Bước 3: Đánh giá HSDX về kỹ thuật				
1	Làm rõ HSDT và sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có).	BMT, Nhà thầu	Điều 29, 30, 31 và Điều 41 NĐ số 214	
2	Kiểm tra và đánh giá HSDX về kỹ thuật			
a	Đánh giá tính hợp lệ của HSDX về kỹ thuật	Tổ chuyên	- Điều 29, Điều 42 NĐ	

b	Đánh giá về NLKN	gia đấu thầu	số 214; - Điều 30 TT số 79.	
c	Đánh giá về kỹ thuật			
d	Trình, thẩm định và phê duyệt KQĐG về kỹ thuật	BMT, CĐT	- Điều 29 NĐ số 214; Khoản 5 Điều 42 NĐ số 214;	
đ	Thông báo kết quả đánh giá HSDX về kỹ thuật và đăng tải danh sách nhà thầu đáp ứng về kỹ thuật trên Hệ thống mạng DTQG	BTM	- Điều 30 TT số 79.	

Bước 4: Mở và đánh giá HSDX về tài chính

1	Mở HSDX về tài chính (BB mở thầu phải được đăng tải trên hệ thống mạng DTQG trong thời hạn 24h kể từ thời điểm mở thầu)	BMT, Nhà thầu	Điều 43 NĐ số 214; Các Điều 29,30 TT số 79	
2	Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của HSDX về tài chính	Tổ chuyên gia đấu thầu	- Khoản 1,2 Điều 44 NĐ số 214; - Điều 30 TT số 79.	
3	Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính và xếp hạng nhà thầu	Tổ chuyên gia đấu thầu	- Khoản 3 Điều 44 NĐ số 214; - Điều 30 TT số 79.	

Bước 5: Thương thảo HĐ


1	Bên mời thầu mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đến thương thảo HĐ	BMT	Điều 45 NĐ số 214; Điều 4 TT số 79.	
2	Thương thảo HĐ	BMT và nhà thầu		

Bước 6: Trình thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả LCNT; hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện HĐ

1	Thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả LCNT	BMT, CĐT, Đơn vị thẩm định	- Điều 33; Khoản 4 Điều 46 NĐ số 214; - Các Điều 4, 31 TT số 79.	
2	Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện HĐ	BMT, CĐT và Nhà thầu trung thầu	- Các điều 34,35; Khoản 2 Điều 46 NĐ số 214; - Điều 31 TT số 79.	

8. Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế không qua mạng; phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ (Điều 32 Luật Đấu thầu 2023; Các điều từ điều 47÷52 NĐ số 214)

a. Sơ đồ tổng quát:

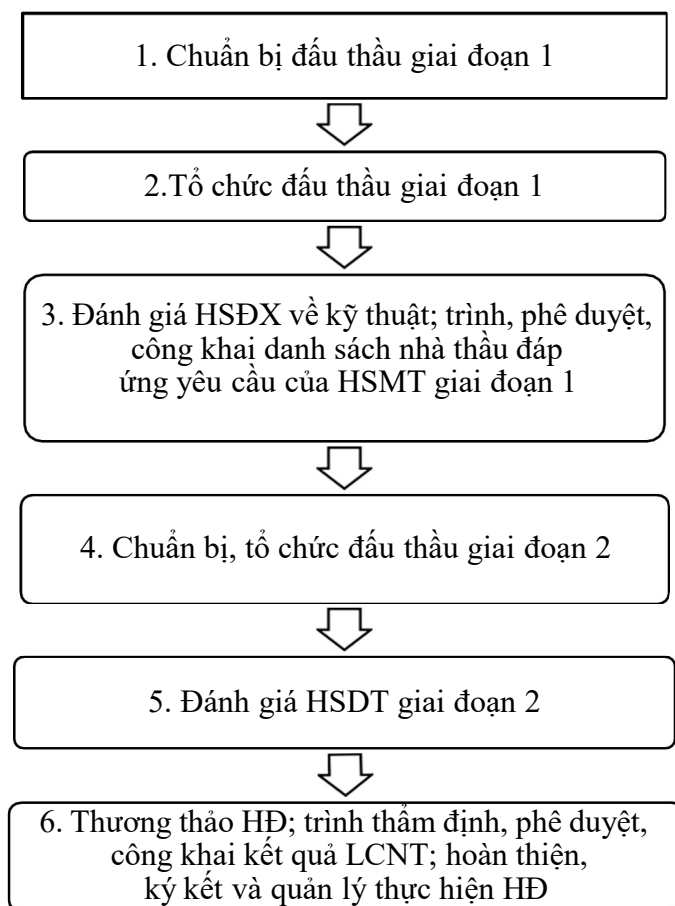

b. Quy trình chi tiết:

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
Bước 1: Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn 1				
1	Lựa chọn DS ngắn (nếu cần thiết)	BMT	- Điều 25; Khoản 1 Điều 47 NĐ số 214; - Các Điều 14, 15 TT số 79	
2	Lập HSMT giai đoạn 1	BMT	- Khoản 1,2 Điều 26; Khoản 2, Điều 47 NĐ số 214; - Điều 4 TT số 79.	
3	Thẩm định và phê duyệt HSMT	Tổ thẩm định, BMT và CĐT	- Khoản 3 Điều 47, Điều 135 NĐ số 14. - Điều 4, 26 TT số 79.	
Bước 2: Tổ chức đấu thầu giai đoạn 1				

1	Mời thầu giai đoạn 1 thực hiện theo K1 Điều 48 NĐ 214	BMT	- Khoản 1 Điều 28 và Khoản 1 Điều 48 NĐ số 214; - Điều 17 TT số 79.	
2	Phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMT	BMT	- Khoản 2 Điều 28 và Khoản 2 Điều 48 NĐ số 214; - Điều 18 TT số 79.	
3	Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút HSDT	Nhà thầu, BMT	- Khoản 3 Điều 28; Khoản 3 Điều 48 NĐ số 214; - Điều 18 TT số 79.	
4	Mở HSDX về kỹ thuật	BMT, các nhà thầu	- Khoản 4 Điều 28; Khoản 4 Điều 48 NĐ số 214; - Điều 29 TT số 79.	

Bước 3: Đánh giá HSDX về kỹ thuật; trình phê duyệt, công khai danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT giai đoạn 1

1	Đánh giá HSDT	Tổ chuyên gia	- Điều 29, Khoản 1 Điều 49 NĐ số 214; - Điều 30 TT số 79.	
2	Làm rõ HSDT	BMT, các nhà thầu	Điều 30, Khoản 2 Điều 49 NĐ số 214;	
3	Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT giai đoạn 1; đăng tải trên Hệ thống MĐTQG chậm nhất 05 ngày kể từ ngày phê duyệt	Đơn vị thẩm định, BMT và CĐT	- Điều 33, Khoản 3 Điều 49 NĐ số 214; - Điều 30 TT số 79.	

Bước 4: Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn 2

1	Trao đổi về HSDT giai đoạn 1	BMT, các nhà thầu	Khoản 1 Điều 50 NĐ số 214;	
2	Lập HSMT giai đoạn 2	BMT	Khoản 1,2 Điều 26; Khoản 2 Điều 50 NĐ số 214.	
3	Thẩm định và phê duyệt HSMT	Đơn vị thẩm định, BMT và CĐT	Khoản 3 Điều 50; Điều 135 NĐ số 214.	
4	Tổ chức đấu thầu			

a	Phát hành HSMT giai đoạn 2 cho các nhà thầu trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT giai đoạn 1	BMT, các nhà thầu	Khoản 2 Điều 28; điểm a Khoản 4 Điều 50 NĐ số 214;	
b	Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu		Khoản 3 Điều 28; điểm b Khoản 4 Điều 50 NĐ số 214;	
5	Mở thầu	BMT, các nhà thầu	Khoản 4 Điều 28; Khoản 5 Điều 50 NĐ số 214;	

Bước 5: Đánh giá HSDT giai đoạn 2


1	Nguyên tắc đánh giá HSDT	BMT	- Điều 29, Khoản 1 Điều 51 NĐ số 214; - Các Điều 29,30 TT số 79	
2	Làm rõ HSDT	BMT, các nhà thầu	Điều 30, Khoản 2 Điều 51 NĐ số 214; - Điều 30 TT số 79.	
3	Sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch HSDT	BMT, các nhà thầu	- Điều 31, Khoản 3 Điều 51 NĐ số 214; - Điều 30 TT số 79.	
4	Đánh giá HSDT	Tổ chuyên gia, BMT	- Điều 32, Khoản 4, Điều 51 NĐ số 214; - Điều 30 TT số 79.	

Bước 6: Thương thảo HĐ; trình thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả LCNT; hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện HĐ

1	BMT mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đến thương thảo HĐ	BMT và nhà thầu	- Điều 45; Khoản 1,2 Điều 52 NĐ số 214; - Điều 4 TT số 79	
2	Thương thảo HĐ			
3	Trình thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả LCNT	Đơn vị thẩm định, BMT và CĐT	- Điều 33; Khoản 3 Điều 52 NĐ số 214; - Các Điều 4, 31 TT số 79	
4	Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện HĐ	BMT, CĐT và Nhà thầu trúng thầu	- Các điều 34,35; Khoản 4 Điều 52 NĐ số 214; - Điều 31 TT số 79.	

9. Quy trình đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ (Điều 33 Luật Đấu thầu 22/2023)

a) Sơ đồ tổng quát:

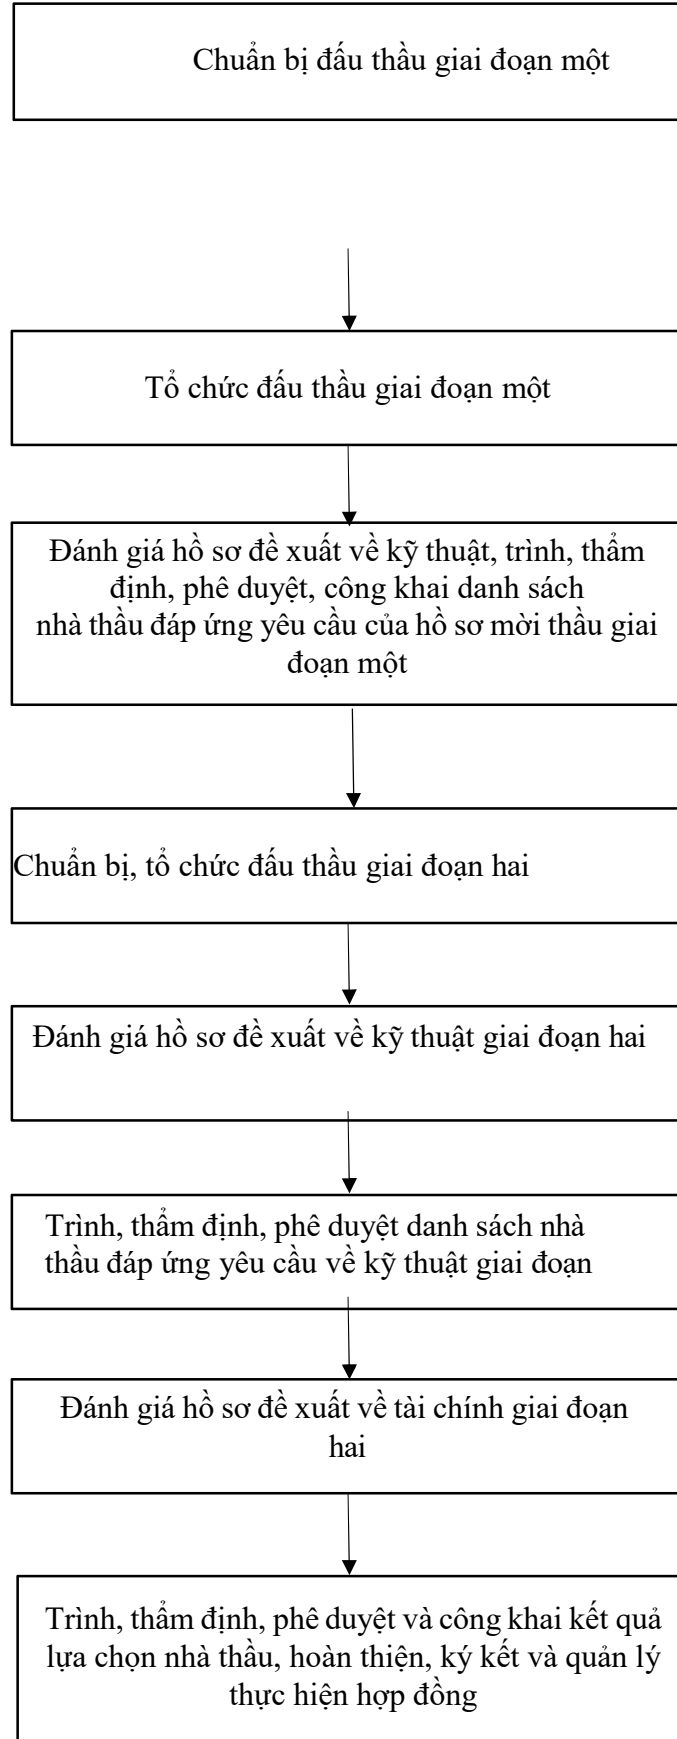

b) Quy trình chi tiết:


TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
Bước 1: Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn 1				
1	Lựa chọn DS ngắn (nếu cần thiết)	BMT	Điều 25; Khoản 1 Điều 53 NĐ số 214	
2	Lập HSMT giai đoạn 1	BMT	Khoản 1,2 Điều 26; Khoản 2 Điều 53 NĐ số 214	
3	Thẩm định và phê duyệt HSMT	Đơn vị thẩm định, BMT và CĐT	Khoản 3 Điều 53, Điều 135 NĐ số 214.	
Bước 2: Tổ chức đấu thầu giai đoạn 1				
1	Mời thầu giai đoạn 1	BMT	Khoản 1 Điều 28 và Khoản 1 Đ54 NĐ số 214	
2	Phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMT	BMT	Khoản 2 Điều 28 và K2 Điều 54 NĐ số 214	
3	Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút HSDT	Nhà thầu, BMT	Khoản 3 Điều 28; Khoản 3 Điều 54 NĐ số 214;	
4	Mở HSDX về kỹ thuật	BMT, các nhà thầu	Khoản 4 Điều 28; Khoản 4 Điều 54 NĐ số 214	
Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, trình, thẩm định, phê duyệt, công khai danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn một				
1	Đánh giá HSDT	Tổ chuyên gia	Điều 29, Khoản 1 Điều 55 NĐ số 214	
2	Làm rõ HSDT	BMT, các nhà thầu	Điều 30, Khoản 2 Điều 55 NĐ số 214	
3	Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT giai đoạn 1; đăng tải trên Hệ thống MĐTQG chậm nhất 05 ngày kể từ ngày phê duyệt	Đơn vị thẩm định, BMT và CĐT	Điều 33, Khoản 3 Điều 55 NĐ số 214	
Bước 4: Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn hai				
1	Trao đổi về HSDT giai đoạn 1	BMT, các nhà thầu	Khoản 1 Điều 56 NĐ số 214	

2	Lập HSMT giai đoạn 2	BMT	Khoản 1,2 Điều 26; Khoản 2 Điều 56 NĐ số 214	
3	Thẩm định và phê duyệt HSMT	Đơn vị thẩm định, BMT và CĐT	Khoản 3 Điều 56; Điều 135 NĐ số 214.	
4	Tổ chức đấu thầu			
a	Phát hành HSMT giai đoạn 2 cho các nhà thầu trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT giai đoạn 1	BMT, các nhà thầu	Khoản 2 Điều 28; điểm a Khoản 4 Điều 56 NĐ số 214	
b	Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu		Khoản 3 Điều 28; điểm b Khoản 4 Điều 56 NĐ số 214	
5	Mở thầu	BMT, các nhà thầu	Khoản 5 Điều 56; Khoản 4 Điều 40 NĐ số 214	
Bước 5: Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật giai đoạn hai				
1	Nguyên tắc đánh giá HSDT	BMT	Điều 29, Khoản 1 Điều 57 NĐ số 214	
2	Làm rõ HSDT	BMT, các nhà thầu	Điều 30, Khoản 2 Điều 57 NĐ số 214	
Bước 6: Trình, thẩm định, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật giai đoạn hai				
1	Trình, thẩm định, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật giai đoạn	Đơn vị thẩm định, BMT và CĐT	Điều 58, Khoản 1, Khoản 3 Điều 136 NĐ số 214	
2	Đăng tải danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	BMT	Khoản 2 Điều 58 NĐ số 214	
Bước 7: Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính giai đoạn hai				
1	Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu	BMT	Điều 29, Khoản 1 Điều 59 NĐ số 214	
2	Làm rõ hồ sơ dự thầu	BMT và nhà thầu	Điều 30, Khoản 2 Điều 59 NĐ số 214	
3	Sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch	BMT và nhà thầu	Điều 31, Khoản 3 Điều 59 NĐ số 214	
4	Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính	BMT	Điều 44, Khoản 4 Điều 59 NĐ số 214	
Bước 8: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng				

1	BMT mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đến thương thảo HĐ	BMT và nhà thầu	Điều 45; Khoản 1,2 Điều 60 NĐ số 214	
2	Thương thảo HĐ			
3	Trình thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả LCNT	Đơn vị thẩm định, BMT và CĐT	Điều 33; Khoản 3 Điều 60 NĐ số 214	
4	Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện HĐ	BMT, CĐT và Nhà thầu trúng thầu	Các điều 34,35; Khoản 4 Điều 60 NĐ số 214	

10. Quy trình chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi

a. Sơ đồ tổng quát

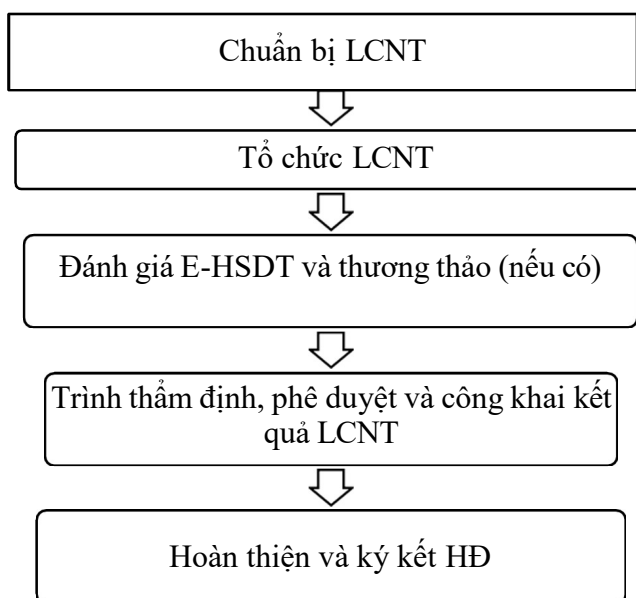


b. Quy trình chi tiết

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
Bước 1: Chuẩn bị LCNT				
1	Lập E- HSMT, Trình thẩm định	BMT	Khoản 1 Điều 81 NĐ số 214	
2	Phê duyệt E-HSMT	CĐT	Khoản 1 Điều 81 NĐ số 214	
Bước 2: Tổ chức LCNT				
1	Phát hành E-HSMT	BMT	Khoản 2, Khoản 3 Điều 81 NĐ số 214	
2	Chuẩn bị và nộp E- HSDT	Nhà thầu		
Bước 3: Đánh giá E-HSDT và thương thảo (nếu có)				
1	Mở E-HSDT	BMT và nhà thầu	Khoản 2, Khoản 3 Điều 81 NĐ số 214	

2	Đánh giá E-HSDT và thương thảo (nếu có)	BMT và nhà thầu	Khoản 2, Khoản 3 Điều 81 ND số 214	
Bước 4: Trình thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu				
1	Trình thẩm định	BMT	Điều 33 và Khoản 4 Điều 81 ND số 214	
2	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	CĐT		
Bước 5: Hoàn thiện và ký kết HĐ				
1	Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện HĐ	CĐT, BMT và nhà thầu	- Các điều 34, 35 ND số 214; - Khoản 5 Điều 81 ND số 214; - ND số 210.	

11. Quy trình Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Điều 21, 30 Luật đấu thầu năm 2023; Điều 98 ND 214)

a. Sơ đồ tổng quát

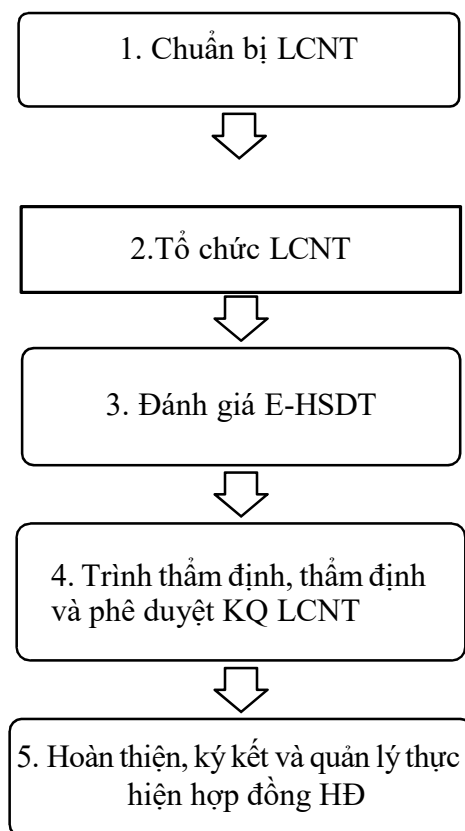

b. Quy trình chi tiết

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
Bước 1: Chuẩn bị LCNT				

1	Lập E-HSMT, trình thẩm định E-HSMT	BMT	- Khoản 1 Điều 98 NĐ số 214; - Điểm a Khoản 1 Điều 25; Điều 26.	
2	Thẩm định E-HSMT	Đơn vị thẩm định	- Khoản 1 Điều 98 - Điểm b Khoản 1 Điều 25 Điều 27 - Điều 135 NĐ số 214	
3	Phê duyệt E-HSMT	CĐT	- Khoản 1 Điều 98 - Điều 135 NĐ số 214	

Bước 2: Tổ chức LCNT

1	Phát hành, sửa đổi, làm rõ E-HSMT	BMT	- Khoản 2 Điều 28 NĐ số 214; - Khoản 2 Điều 40 NĐ số 214; - Điều 18 TT số 79.	
2	Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, sửa đổi, rút E-HSDT	Nhà thầu	- Khoản 2, Khoản 3 Điều 98 NĐ số 214; - Điều 29, 30 TT số 79	

Bước 3: Đánh giá E-HSDT

1	Mở E-HSDT	BMT	K2, K3 Điều 97 NĐ số 214; Điều 28, 29 TT số 22	
2	Đánh giá E-HSDT	BMT	- Điểm e K1 Điều 23 - NĐ số 214	

Bước 4: Trình thẩm định, thẩm định và phê duyệt KQ LCNT


1	Trình thẩm định	BMT	Điều 33; Khoản 4 Điều 46 NĐ số 214; Các Điều 4, 31 TT số 79.	
2	Thẩm định KQLCNT	Đơn vị thẩm định	Điều 31 - TT số 79.	
3	Phê duyệt KQLCNT qua mạng	CĐT		

Bước 5: Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng HĐ

1	Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng HĐ	CĐT, BMT và nhà thầu	- Chương IX- NĐ số 214 - Điểm b Khoản 1 và Khoản 4 Điều 8 của Luật Đấu thầu 2023 - Điều 32 - TT số 79.	
---	---	----------------------	--	--

12. Quy trình đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (Điều 21, 31 Luật Đấu thầu năm 2023; Điều 98 NBĐ 214).

a) Sơ đồ tổng quát

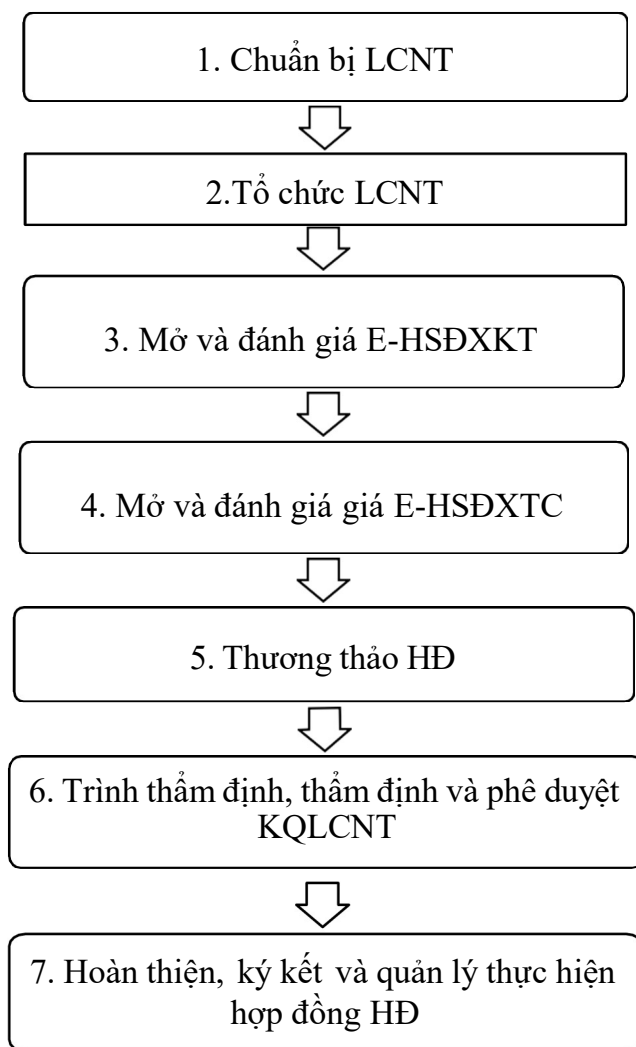

b) Quy trình chi tiết:

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
Bước 1: Chuẩn bị LCNT				
1	Lập E-HSMT, trình thẩm định E-HSMT	BMT	Điều 37, 38 NBĐ số 214	
2	Thẩm định E-HSMT	Đơn vị thẩm định	Điều 5, Điều 26 TT số 79	
3	Phê duyệt E-HSMT	CDT	- Khoản 1 Điều 98, Điều 135 NBĐ số 214. - Điều 4, Điều 26 TT số 79.	

Bước 2: Tổ chức LCNT

1	Phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMT	BMT	- Khoản 2 Điều 28, Khoản 2 Điều 40 NĐ số 214; Điều 18 TT số 79.	
2	Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, sửa đổi, rút E-HSDT	Nhà thầu	- Khoản 3 Điều 40 NĐ số 214; Điều 18 TT số 79.	

Bước 3: Mở và đánh giá E-HSDXKT

1	Mở E-HSDXKT	BMT	- Khoản 2, Khoản 3 Điều 98 NĐ số 214; - Điều 29,30 TT số 79	
2	Làm rõ E-HSDXKT và sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có).	BMT, Nhà thầu	Khoản 4, Khoản 5 Điều 98 NĐ số 214	
3	Kiểm tra và đánh giá E-HSDXKT		- Khoản 2, Khoản 3 Điều 98 NĐ số 214; - Điều 30,31 TT số 79.	
a	Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDXKT	Tổ chuyên gia đấu thầu		
b	Trình thẩm định KQĐG về E-HSDXKT	BMT		
c	Thẩm định KQĐG về E-HSDXKT và trình phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp ứng YCKT	Đơn vị thẩm định		
d	Phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp ứng YCKT	CDT		

Bước 4: Mở và đánh giá E-HSDXTC


1	Mở E-HSDXTC	BMT	- Khoản 2, Khoản 3 Điều 98 NĐ số 214; - Điều 29,30 TT số 79	
2	Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của E-HSDXTC	Tổ chuyên gia đấu thầu		
3	Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính và xếp hạng nhà thầu (nếu có)	Tổ chuyên gia đấu thầu		

Bước 5: Thương thảo HĐ (nếu có)

1	Bêu mời thầu mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đến thương thảo HĐ	BMT	- Điều 45 NĐ số 214;	
2	Thương thảo HĐ	BMT và nhà thầu	- Điều 4 TT số 79.	
Bước 6: Trình thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả LCNT; hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện HĐ				
1	Trình thẩm định KQLCNT	BMT	- Điều 33; Khoản 4 Điều 46 NĐ số 214; - Điều 4, Điều 31 TT số 79.	
2	Thẩm định KQLCNT	Đơn vị thẩm định	Điều 31 - TT số 79	
3	Phê duyệt KQLCNT qua mạng	CĐT		
5	Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện HĐ	BMT, CĐT và Nhà thầu trúng thầu	- Khoản 1 Điều 98 NĐ số 214; - Điều 32 - TT số 79.	

13. Quy trình đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ (Điều 32 Luật Đấu thầu năm 2023)

a. Sơ đồ tổng quát:

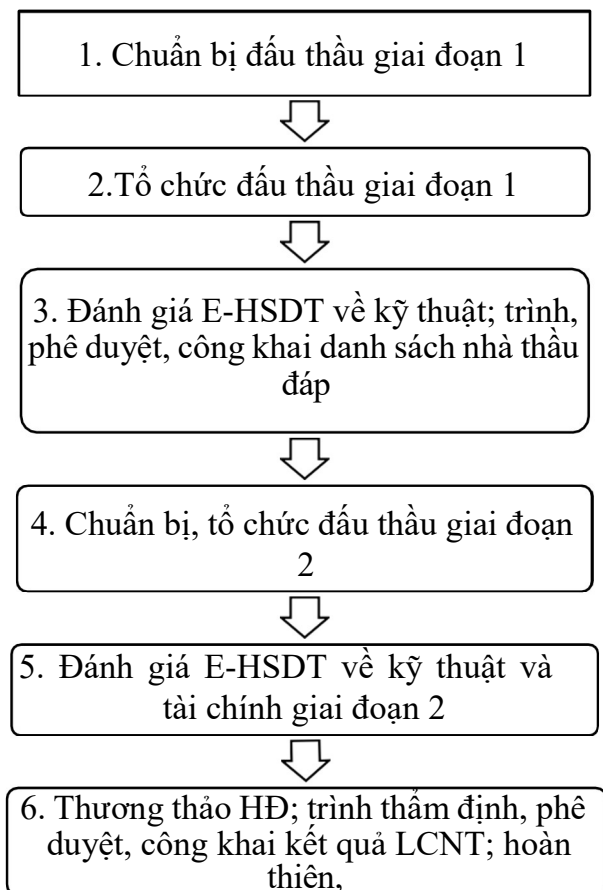

b. Quy trình chi tiết:

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
Bước 1: Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn 1				
1	Lựa chọn DS ngắn (nếu cần thiết)	BMT	- Khoản 1 Điều 47 NĐ số 214; - Điều 15 TT số 79.	
2	Lập E-HSMT giai đoạn 1	BMT	- Khoản 2 Điều 47 NĐ số 214; - Điều 4, 25 TT số 79.	
3	Thẩm định E-HSMT giai đoạn 1	Tổ thẩm định	- Khoản 3 Điều 47 NĐ số 214; Điều 4, 25 TT số 79.	
4	Phê duyệt E-HSMT giai đoạn 1	CĐT	- Khoản 3 Điều 47, Điều 135 NĐ số 214. - Điều 4, Điều 25 TT số 79.	

Bước 2: Tổ chức đấu thầu giai đoạn 1				
1	Phát hành, sửa đổi, làm rõ E-HSMT giai đoạn 1	BMT	- Khoản 1, Khoản 2 Điều 48, NĐ số 214; - Điều 18 TT số 79.	
2	Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút HSDT	Nhà thầu, BMT	- Khoản 3 Điều 48 NĐ số 214; - Điều 18 TT số 79.	
3	Mở E-HSDX về kỹ thuật	BMT, các nhà thầu	- Khoản 4 Điều 48 NĐ số 214; - Điều 29, 30 TT số 79.	
Bước 3: Đánh giá E-HSDX về kỹ thuật; trình phê duyệt, công khai danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT giai đoạn 1				
1	Làm rõ E-HSDX về kỹ thuật và sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có).	BMT, các nhà thầu	Điều 49 NĐ số 214	
2	Đánh giá E-HSDX về kỹ thuật	Tổ chuyên gia đấu thầu	- Điều 49 NĐ số 214; Điều 30, 31 TT số 79.	
3	Trình thẩm định KQĐG về E-HSDX về kỹ thuật	BMT		
4	Thẩm định KQĐG về E-HSDX về kỹ thuật và trình phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp ứng YCKT	Đơn vị thẩm định		
5	Phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp ứng YCKT	CĐT		
Bước 4: Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn 2				
1	Trao đổi về E-HSDT giai đoạn 1	BMT, CĐT, các nhà thầu	Khoản 1 Điều 50 NĐ số 214	
2	Lập E-HSMT giai đoạn 2	BMT	Khoản 2 Điều 50 NĐ số 214.	
3	Thẩm định E-HSMT giai đoạn 2	Tổ thẩm định	- Khoản 3 Điều 50 NĐ số 214. - Điều 4, Điều 26 TT số 79.	
4	Phê duyệt E-HSMT giai đoạn 2	CĐT	- Khoản 3 Điều 50 NĐ số 214. - Điều 4, Điều 26 TT số 79.	
5	Tổ chức đấu thầu			
a	Phát hành E-HSMT giai đoạn 2 cho các nhà thầu trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	BMT, các nhà thầu	Điểm a Khoản 4 Điều 50 NĐ số 214	

	giai đoạn 1			
b	Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, sửa đổi, rút E- HSDT		Điểm b Khoản 4 Điều 50 NĐ số 214	
c	Mở E-HSDT về kỹ thuật và tài chính giai đoạn 2	BMT, các nhà thầu	Khoản 5 Điều 50 NĐ số 214	

Bước 5: Đánh giá E-HSDT về kỹ thuật và tài chính giai đoạn 2


1	Đánh giá E-HSDT về kỹ thuật và tài chính giai đoạn 2	Tổ chuyên gia	- Điều 51 NĐ số 214	
2	Làm rõ và sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch E- HSDT về kỹ thuật và tài chính giai đoạn 2	BMT, các nhà thầu	- Các Điều 29, Điều 30 TT số 79	

Bước 6: Thương thảo HĐ; trình thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả LCNT; hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện HĐ

1	BMT mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đến thương thảo HĐ	BMT và nhà thầu	-Điều 52 NĐ số 214 -Điều 31 - TT số 79.	
2	Thương thảo HĐ			
3	Trình thẩm định KQLCNT	BMT		
4	Thẩm định KQLCNT	Đơn vị thẩm định		
5	Phê duyệt KQLCNT qua mạng	CĐT		
6	Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện HĐ	BMT, CĐT và Nhà thầu trúng thầu		

14. Quy trình đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ (Điều 33 Luật Đấu thầu năm 2023)

a) Sơ đồ tổng quát:

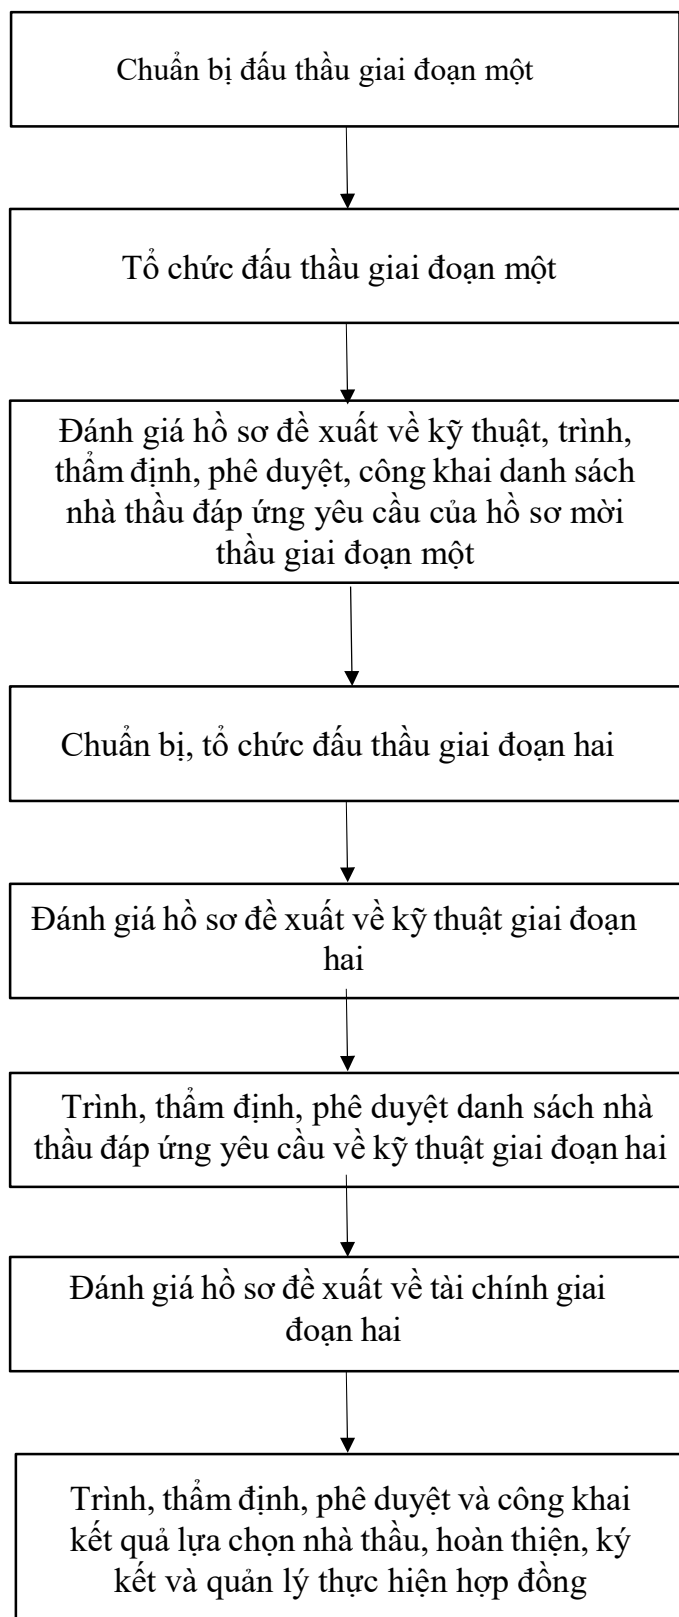

b) Quy trình chi tiết:

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
Bước 1: Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn 1				
1	Lựa chọn DS ngắn (nếu cần thiết)	BMT	Khoản 1 Điều 53 NĐ số 214	
2	Lập E-HSMT giai đoạn 1	BMT	Khoản 1,2 Điều 26; Khoản 2 Điều 53 NĐ số 214	
3	Thẩm định E-HSMT giai đoạn 1	Tổ thẩm định	Khoản 3 Điều 53, Điều 135 NĐ số 214.	
4	Phê duyệt E-HSMT giai đoạn 1	CĐT	Khoản 3 Điều 53, Điều 135 NĐ số 214.	
Bước 2: Tổ chức đấu thầu giai đoạn 1				
1	Phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMT	BMT	Khoản 2 Điều 28 và Khoản 2 Điều 54 NĐ số 214.	
2	Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút HSDT	Nhà thầu, BMT	Khoản 3 Điều 28; Khoản 3 Điều 54 NĐ số 214;	
3	Mở E-HSDX về kỹ thuật	BMT, các nhà thầu	Khoản 4 Điều 28; Khoản 4 Điều 54 NĐ số 214	
Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, trình, thẩm định, phê duyệt, công khai danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn một				
1	Đánh giá E-HSDT	Tổ chuyên gia	Điều 29, Điều 55 NĐ số 214	
2	Làm rõ E-HSDT	BMT, các nhà thầu	Điều 30, Khoản 2 Điều 55 NĐ số 214	
3	Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT giai đoạn 1; đăng tải trên Hệ thống MĐTQG chậm nhất 05 ngày kể từ ngày phê duyệt	Đơn vị thẩm định, BMT và CĐT	Điều 33, Khoản 3 Điều 55 NĐ số 214	
Bước 4: Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn hai				
1	Trao đổi về E-HSDT giai đoạn 1	BMT, các nhà thầu	Khoản 1 Điều 56 NĐ số 214	
2	Lập E-HSMT giai đoạn 2	BMT	Khoản 1,2 Điều 26; Khoản 2 Điều 56 NĐ số 214.	

3	Thẩm định E-HSMT giai đoạn 2	Tổ thẩm định	Khoản 3 Điều 56; Điều 135 NĐ số 214.	
4	Phê duyệt E-HSMT giai đoạn 2	CĐT	Khoản 3 Điều 56; Điều 135 NĐ số 214.	
5	Tổ chức đấu thầu			
a	Phát hành E-HSMT giai đoạn 2 cho các nhà thầu trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT giai đoạn 1	BMT, các nhà thầu	Khoản 2 Điều 28; điểm a Khoản 4 Điều 56 NĐ số 214;	
b	Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu		Khoản 3 Điều 28; điểm b Khoản 4 Điều 56 NĐ số 214	
5	Mở thầu	BMT, các nhà thầu	Khoản 5 Điều 56; Khoản 4 Điều 40 NĐ số 214	

Bước 5: Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật giai đoạn hai

1	Nguyên tắc đánh giá về E-HSĐX về kỹ thuật	BMT	Điều 29, Khoản 1 Điều 57 NĐ số 214	
2	Làm rõ về E-HSĐX về kỹ thuật	BMT, các nhà thầu	Điều 30, Khoản 2 Điều 57 NĐ số 214	

Bước 6: Trình, thẩm định, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật giai đoạn hai

1	Trình thẩm định KQĐG về E-HSĐX về kỹ thuật	BMT	Điều 58, Khoản 1, Khoản 3 Điều 136 NĐ số 214	
2	Thẩm định KQĐG về E-HSĐX về kỹ thuật và trình phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp ứng YCKT	Đơn vị thẩm định		
3	Phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp ứng YCKT	CĐT		
4	Mở E-HSĐX về tài chính	BMT		

Bước 7: Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính giai đoạn hai

1	Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu	BMT	Điều 29, Khoản 1 Điều 59 NĐ số 214	
2	Làm rõ hồ sơ dự thầu	BMT và nhà thầu	Điều 30, Khoản 2 Điều 59 NĐ số 214	
3	Sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch	BMT và nhà thầu	Điều 31, Khoản 3 Điều 59 NĐ số 214	

4	Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính	BMT	Điều 44, Khoản 4 Điều 59 NĐ số 214	
Bước 8: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng				
1	BMT mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đến thương thảo HĐ	BMT và nhà thầu	Điều 45; Khoản 1,2 Điều 60 NĐ số 214	
2	Thương thảo HĐ			
3	Trình thẩm định KQLCNT	BMT	Điều 33; Khoản 3 Điều 60 NĐ số 214	
4	Thẩm định KQLCNT	Đơn vị thẩm định		
5	Phê duyệt KQLCNT qua mạng	CĐT		
6	Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện HĐ	BMT, CĐT và Nhà thầu trúng thầu	Các điều 34,35; Khoản 4 Điều 60 NĐ số 214	

15. Bảng chi tiết các bước và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (để tham khảo)

STT	Nội dung công việc	Tiến độ (ngày)
	Tổ chức lựa chọn nhà thầu (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ)	47
1	Phát hành hồ sơ mời thầu	18
2	Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật	1
3	Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật	5
4	Làm rõ hồ sơ đề xuất kỹ thuật (01 lần)	3
5	Lập báo cáo đánh giá và trình duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng về kỹ thuật	1
6	Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật	2
7	Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật	1
8	Mở đề xuất tài chính	1
9	Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính	2
10	Mời đối chiếu tài liệu + mời đến thương thảo hợp đồng	3
11	Trình thẩm định và phê duyệt xếp hạng nhà thầu	2
12	Thương thảo và trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	1
13	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	2
14	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	1
15	Thông báo thư chấp thuận và hoàn thiện hợp đồng	3
16	Ký hợp đồng	1

Phụ lục 2**Mẫu các Văn bản, Báo cáo, Tờ trình, Quyết định**

Mẫu	Danh mục các văn bản
Mẫu 1	Mẫu Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư chương trình/dự án đầu tư công (Theo mẫu số 01 - Phụ lục 2 kèm theo Nghị định số 85/2025/ NĐ-CP).
Mẫu 2	Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công (Theo mẫu số 02 - Phụ lục 2 kèm theo Nghị định số 85/2025/ NĐ-CP).
Mẫu 3	Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A (Theo mẫu số 03 - Phụ lục 2 kèm theo Nghị định số 85/2025/ NĐ-CP).
Mẫu 4	Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C (Theo mẫu số 04 - Phụ lục 2 kèm theo Nghị định số 85/2025/ NĐ-CP).
Mẫu 5	Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình (Theo mẫu số 05 - Phụ lục 2 kèm theo Nghị định số 85/2025/ NĐ-CP).
Mẫu 6	Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Theo mẫu số 06 - Phụ lục 2 kèm theo Nghị định số 85/2025/ NĐ-CP).
Mẫu 7	Nghị quyết (Quyết định) về chủ trương đầu tư chương trình (Theo mẫu số 07 - Phụ lục 2 kèm theo Nghị định số 85/2025/ NĐ-CP).
Mẫu 8	Nghị quyết (Quyết định) về chủ trương đầu tư dự án đầu tư công (Theo mẫu số 08 - Phụ lục 2 kèm theo Nghị định số 85/2025/ NĐ-CP).
Mẫu 9	Mẫu văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Theo Mẫu số 02A - Phụ lục kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC).
Mẫu 10	Mẫu Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Theo Mẫu số 02B - Phụ lục kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC).
Mẫu 11	Mẫu văn bản trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD Theo Mẫu số 01 Văn bản đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dùng Mẫu số 04; văn bản đề nghị thẩm định BCNCKT dùng Mẫu số 05.(Phụ lục I kèm theo Nghị định số 217/2026/NĐ-CP).
Mẫu 11a	Mẫu Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD của cơ quan chuyên môn về xây dựng (Theo Mẫu số 03 - Phụ lục I kèm theo Nghị định số 217/2026/NĐ-CP).
Mẫu 11b	Mẫu Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD của Đơn vị được Người quyết định đầu tư giao thẩm định (Theo Mẫu số 07 - Phụ lục I kèm theo Nghị định số 217/2026/NĐ-CP).

Mẫu 11c	Mẫu Thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Theo Mẫu số 06 - Phụ lục I kèm theo Nghị định số 217/2026/NĐ-CP).
Mẫu 12a	Mẫu Quyết định phê duyệt dự án yêu cầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Theo Mẫu số 09 - Phụ lục I kèm theo Nghị định số 217/2026/NĐ-CP).
Mẫu 12b	Mẫu Quyết định phê duyệt dự án (áp dụng đối với dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD) (Theo Mẫu số 10 - Phụ lục I kèm theo Nghị định số 217/2026/NĐ-CP).
Mẫu 13	Mẫu Tờ trình đề nghị thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Theo Nghị định số 217/2026/NĐ-CP không ban hành mẫu tờ trình; hồ sơ trình thẩm định lập theo Điều 41 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP)
Mẫu 14	Mẫu Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng (Theo Mẫu số 12 - Phụ lục I kèm theo Nghị định số 217/2026/NĐ-CP).
Mẫu 15	Mẫu Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt (Theo Mẫu số 13 - Phụ lục I kèm theo Nghị định số 217/2026/NĐ-CP).
Mẫu 16	Mẫu Thông báo khởi công xây dựng công trình (Theo Phụ lục V kèm theo Nghị định số 207/2026/NĐ-CP)
Mẫu 17	Mẫu Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng công trình (theo Mẫu IVa – Phụ lục IV Nghị định số 207/2026/NĐ-CP)
Mẫu 18	Mẫu Báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng công trình (theo Mẫu IVb – Phụ lục IV Nghị định số 207/2026/NĐ-CP)
Mẫu 19	Mẫu Hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng, bao gồm Mẫu số 19A - Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng, Mẫu số 19B - Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình (Theo Phụ lục VI. Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng và Phụ lục VII. Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình kèm theo Nghị định số 207/2026/NĐ-CP).
Mẫu 20	Mẫu Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu (Theo Phụ lục VIII kèm theo Nghị định số 207/2026/NĐ-CP).
Mẫu 21	Mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn (Theo Mẫu số 04.a/TT, 04.a.nn/TT, 04.b.nn/TT kèm theo Nghị định số 254/2025/NĐ-CP)
Mẫu 22	Giấy đề nghị thu hồi vốn (Theo Mẫu số 04.b/TT kèm theo Nghị định số 254/ 2025/NĐ-CP)
Mẫu 23	Giấy đề nghị thu hồi vốn ứng trước (Theo Mẫu số 04.c/TT kèm theo Nghị định số 254/2025/NĐ-CP).

Mẫu 24	Mẫu Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (Theo Mẫu số 04.d/TT kèm theo Nghị định số 254/2025/ NĐ- CP)
Mẫu 25	Mẫu Giấy rút vốn (Theo Mẫu số 05.a/TT kèm theo Nghị định số 254/2025/ NĐ- CP)
Mẫu 26	Mẫu Giấy rút vốn (Theo Mẫu số 05.a/TT kèm theo Nghị định số 254/2025/NĐ-CP) - TRÙNG với Mẫu 29. Phụ lục Nghị định số 254/2025/NĐ-CP chỉ có một Mẫu số 05.a/TT. Đề nghị rà soát: có thể là Mẫu số 06/TT (Giấy rút vốn kiêm thu ngân sách nhà nước) hoặc Mẫu số 07/TT (Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ).
Mẫu 27	Mẫu Giấy ủy nhiệm chi (Theo Mẫu số 05.b/TT, 05.c/TT, 05.d/TT, 05.e/TT kèm theo Nghị định số 254/2025/ NĐ- CP)
Mẫu 28	Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (Theo Mẫu số 03.a/TT kèm theo Nghị định số 254/2025/NĐ-CP)
Mẫu 29	Bảng kê giá trị khối lượng công việc đền bù, hỗ trợ, tái định cư (Theo Mẫu số 03.b/TT kèm theo Nghị định số 254/2025/NĐ-CP).
Mẫu 30	Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu (Quyết toán A-B) - (Theo Mẫu số 01/QTDA, kèm theo Nghị định số 193/2026/NĐ-CP).
Mẫu 31	Bảng phân bổ chi phí quản lý dự án đề nghị thanh toán hoàn tạm ứng chi phí quản lý dự án (Theo Mẫu số 09/QLDA kèm theo Nghị định số 254/ 2025/NĐ-CP)
	Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán theo niên độ
Mẫu 32	Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách của bộ, cơ quan trung ương và chủ đầu tư (Theo Mẫu số 01/QTNĐ kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC)
Mẫu 33	Báo cáo về việc thực hiện vốn đầu tư các dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn ngân sách nhà nước (do Quốc hội quyết định) của cơ quan báo cáo và chủ đầu tư (Theo Mẫu số 02/QTNĐ kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC).
Mẫu 34	Báo cáo chi tiết quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương theo năm ngân sách của cơ quan thanh toán (Theo Mẫu số 03/QTNĐ kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC)
Mẫu 35	Mẫu thông báo xét duyệt quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách của cơ quan cấp trên của chủ đầu tư (Theo Mẫu số 04/QTNĐ kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC)
Mẫu 36	Mẫu văn bản kiểm tra quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách của cơ quan tài chính (Theo Mẫu số 05/QTNĐ kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC).

	Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành
Mẫu 37	Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (Theo Mẫu số 01/QTDA kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC).
Mẫu 38	Danh mục văn bản (Theo Mẫu số 02/QTDA kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC).
Mẫu 39	Bảng đối chiếu số liệu (Theo Mẫu số 03/QTDA kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC).
Mẫu 40	Chi tiết chi phí đầu tư đề nghị quyết toán (Theo Mẫu số 04/QTDA kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC).
Mẫu 41	Chi tiết tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án (Theo Mẫu số 05/QTDA kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC)
Mẫu 42	Chi tiết giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (Theo Mẫu số 06/QTDA kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC).
Mẫu 43	Tình hình công nợ của dự án (Theo Mẫu số 07/QTDA kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC).
Mẫu 44	Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (dùng cho dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư sử dụng vốn đầu tư công, dự án dừng thực hiện chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị): (Theo Mẫu số 08/QTDA kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC).
Mẫu 45	Báo cáo kết quả phê duyệt tổng quyết toán vốn đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A hoàn thành (Theo Mẫu số 09/QTDA kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC).
Mẫu 46	Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình độc lập) hoàn thành (Theo Mẫu số 10/QTDA kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC).
Mẫu 47	Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành hàng năm: Mẫu số 11/QTDA (bao gồm cả phần lời và Mẫu biểu) kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC).
Mẫu 48	Phiếu giao nhận Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (Theo Mẫu số 12/QTDA kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC).
	Sử dụng mẫu biểu
Mẫu 49	Đối với quyết toán theo niên độ: (Theo Mẫu số 01/QTND, Mẫu số 02/QTND, Mẫu số 03/QTND kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC).
